


Extrato Municipal - Bodocó

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Bodocó

Mapa do município

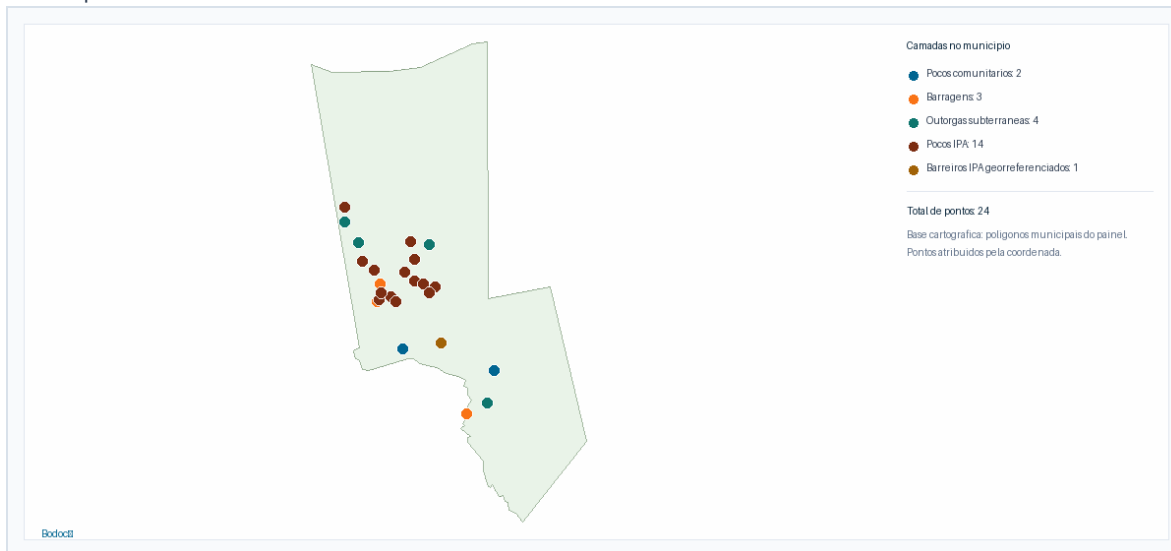

Populacao aglomerada	1.265	5 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	8	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	3
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	3
Outorgas subterraneas	4
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	13
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituicao	Resumo
Compesa	7 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 64,2 mi atribuidos; abastecimento: Area em colapso
SDA	0 PAD; 0 PISF; 40 aguadas; 0 cisternas
IPA	28 pocos; 1 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	3 Pocos comunitarios; 3 Barragens; 4 Outorgas subterraneas

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	7
Concluídas	1
Em execucao	4
Planejadas	2
Investimento municipal	R\$ 64,2 mi
Investimento ativo	R\$ 62,8 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste em Jacaré - Parnamirim. Data: 2026-08-18; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Area em colapso
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	32.1%
Areas publicadas	21
Abastecimento continuo	1
Areas em rodizio	19
Areas em colapso	1
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 10.3 dias com agua / 7 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 11 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 12 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0060	Sistema Adutor de Negreiros para reforço da Adutora do Oeste	Em andamento	5%	Concluir obra 2027-12-01	R\$ 25,1 mi
GPI0277	Ampliação do Sistema Adutor do Oeste	A fazer	0%	Emitir Ordem de Serviço (Obra) 2027-04-02	R\$ 20,8 mi
GPI0282	Poços do Sertão	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-10-01	R\$ 16,2 mi
GPI0370	Convênio com a prefeitura para substituição de adutora para o distrito Sipaúba,	Concluído	100%	- 2025-10-31	R\$ 1,4 mi
GPI0195	Substituição de 2,5 Km de Adutora da ETA Luiz Gonzaga para Exu, no município de	Em andamento	93%	Concluir obra 2026-10-15	R\$ 627.343

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0225	Requalificação da estação elevatória de captação de água do sistema adutor do Oe	Em andamento	0%	Concluir obra 2026-08-18	R\$ 12.999
GPI0224	Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste	Em andamento	0%	Concluir obra 2026-08-18	R\$ 9.227

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
