


Extrato Municipal - Brejo Da Madre De Deus

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Brejo Da Madre De Deus

Mapa do município

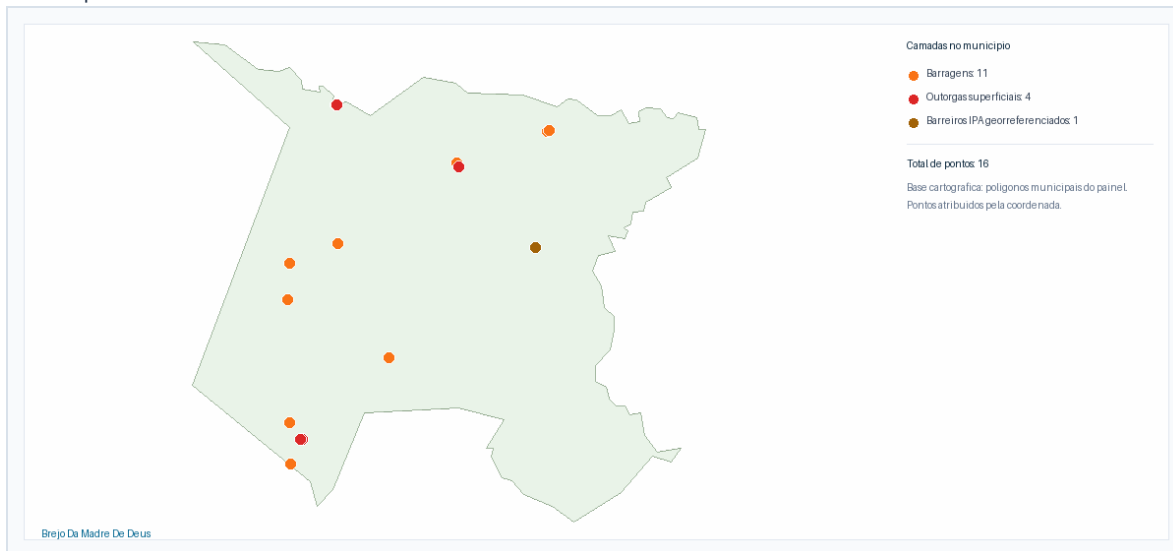

População aglomerada	4.250	23 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 23. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	10
Outorgas subterraneas	0
Outorgas superficiais	5
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituicao	Resumo
Compesa	7 iniciativas; 10 projetos KML; R\$ 65,8 mi atribuídos; abastecimento: Sem calendario publicado
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 182 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	10 Barragens; 5 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	7
Concluídas	3
Em execucao	2
Planejadas	2
Investimento municipal	R\$ 65,8 mi
Investimento ativo	R\$ 60,8 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Melhoria e ampliação da ETA Machado. Data: 2026-08-31; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Sem calendario publicado
Situacao predominante	Sem calendario publicado
Cobertura programada ponderada	0.0%
Areas publicadas	28
Abastecimento continuo	0
Areas em rodizio	0
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	28

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0004	Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 5C (Brejo da Madre de Deus	Em andamento	92%	Concluir obra 2026-09-30	R\$ 57,3 mi
GPI0001	Estação Elevatória de Água Bruta da 1ª etapa da Adutora do Sistema Adutor do Agr	Concluído	100%	- 2024-02-29	R\$ 4,8 mi
GPI0206	Implantação da Adutora de Pedra Branca e Adequação do SAA Santa Cruz do Capibari	Em andamento	6%	Concluir obra 2027-05-02	R\$ 1,6 mi
GPI0222	Melhoria e Ampliação do SAA Santa Cruz do Capibaribe (Tabocas)	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-09-30	R\$ 1,0 mi
GPI0203	Melhoria e ampliação da ETA Machado	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-31	R\$ 908.195
GPI0359	Implantação da Captação Emergencial Barragem de Góis - PISF	Concluído	100%	- 2025-12-12	R\$ 182.695
GPI0606	Adequação da ETA Barra do Farias	Concluído	100%	- 2023-09-15	R\$ 29.487

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
