


# Extrato Municipal - Camocim De São Félix

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

## Camocim De São Félix

Mapa do município

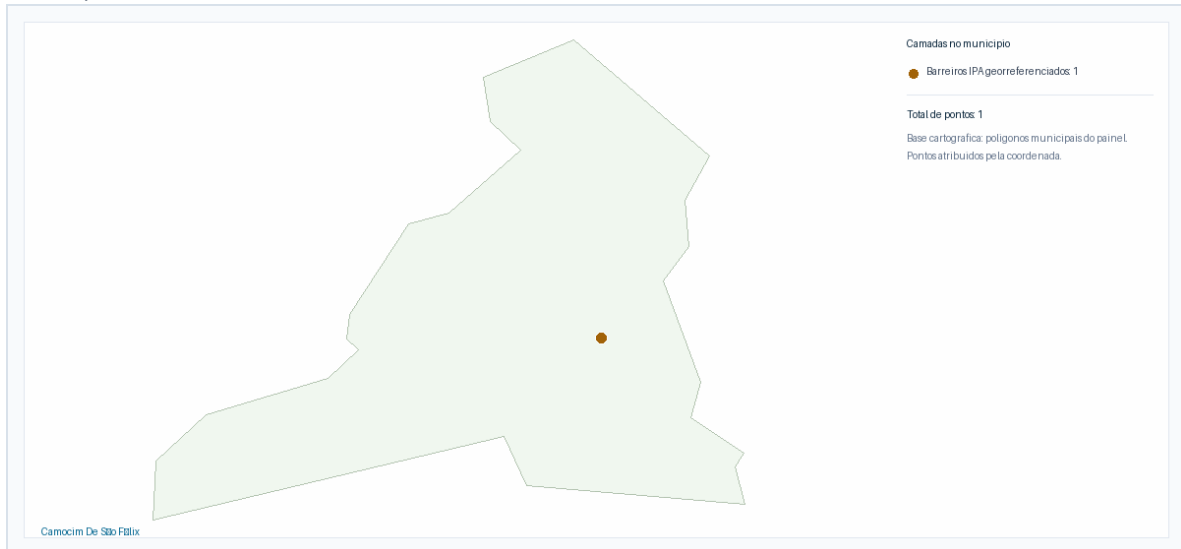

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| População aglomerada  | 315 | 2 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada. |
| Decreto de estiagem   | Não | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitários              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 0          |
| Outorgas subterrâneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituição | Resumo                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 5 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 55,4 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas                                         |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                     |
| SRHS        | Sem registros SRHS nas bases pontuais.                                        |

#### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 5                                       |
| Concluídas             | 1                                       |
| Em execucao            | 1                                       |
| Planejadas             | 3                                       |
| Investimento municipal | R\$ 55,4 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 38,2 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Concluir obra - Ampliação do Sistema Produtor de Água de Camocim de São Félix. Data: 2026-08-31; execucao: 89%.

#### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador                      | Valor   |
|--------------------------------|---------|
| Mes de referencia              | 2026-08 |
| Situacao mais critica          | Rodizio |
| Situacao predominante          | Rodizio |
| Cobertura programada ponderada | 50.4%   |
| Areas publicadas               | 7       |
| Abastecimento continuo         | 0       |
| Areas em rodizio               | 7       |
| Areas em colapso               | 0       |
| Mes sem abastecimento          | 0       |
| Sem calendario publicado       | 0       |

Padroes observados: Rodizio: 1 dia com agua / 1 dia sem agua | Rodizio: 1 dia com agua / 23 h sem agua | Rodizio: 11 h com agua / 1.8 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Todas as iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                      | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0029 | Conclusão Adutora de Serro Azul                                                 | Concluído    | 100%  | -   2026-04-30                            | R\$ 17,2 mi     |
| GPI0719 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 06                                        | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2027-07-01 | R\$ 15,0 mi     |
| GPI0710 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo  | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 11,3 mi     |
| GPI0709 | 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-12-30 | R\$ 8,4 mi      |
| GPI0187 | Ampliação do Sistema Produtor de Água de Camocim de São Félix                   | Em andamento | 89%   | Concluir obra   2026-08-31                | R\$ 3,5 mi      |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
