


Extrato Municipal - Goiana

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Goiana

Mapa do município

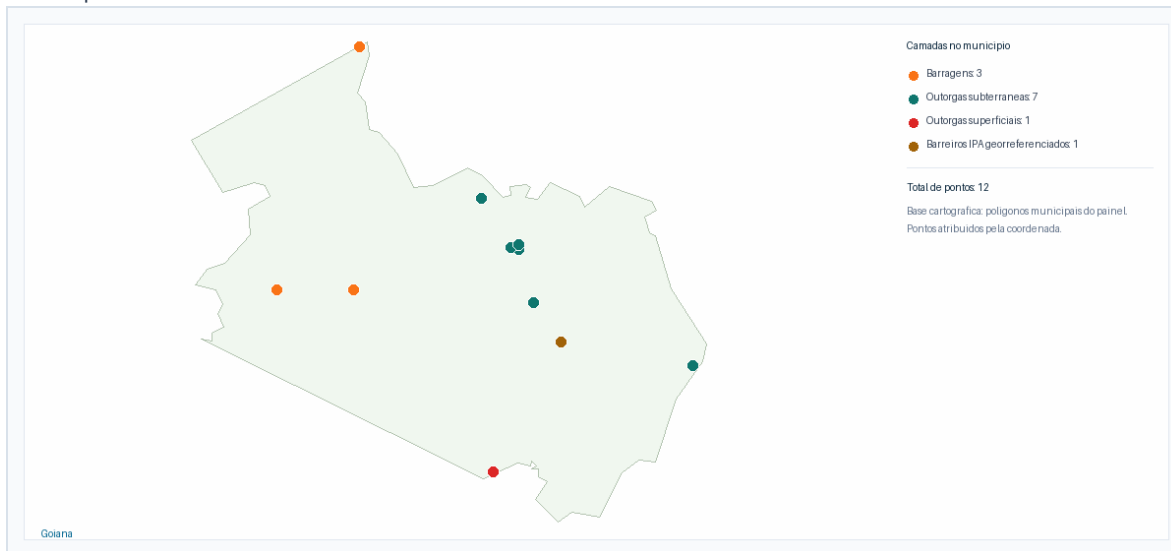

População aglomerada	2.122	11 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	7	Lacuna estimada: 4. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	3
Outorgas subterrâneas	7
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	3 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 6,6 mi atribuídos; abastecimento: Rodizio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	3 Barragens; 7 Outorgas subterrâneas; 1 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	3
Concluídas	1
Em execucao	1
Planejadas	1
Investimento municipal	R\$ 6,6 mi
Investimento ativo	R\$ 6,5 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Retrofit da ETA Goiana e Requalificação da Estação Elevatória Dois Rios. Data: 2026-09-30; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	57.9%
Areas publicadas	13
Abastecimento continuo	3
Areas em rodizio	10
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 8 h com agua / 1.7 dias sem agua | Rodizio: 5 h com agua / 3.8 dias sem agua | Intermitente diario: 2.5 h com agua / 6 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0186	Poços RMR - 4 -Reforço do SAA de Goiana a partir dos Poços do Polo Farmacoquímico	Em andamento	77%	Concluir obra 2027-02-26	R\$ 3,5 mi
GPI0217	Retrofit da ETA Goiana e Requalificação da Estação Elevatória Dois Rios	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-09-30	R\$ 3,0 mi
GPI0682	Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água	Concluído	100%	- 2026-06-30	R\$ 59.708

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
