


Extrato Municipal - Granito

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Granito

Mapa do município

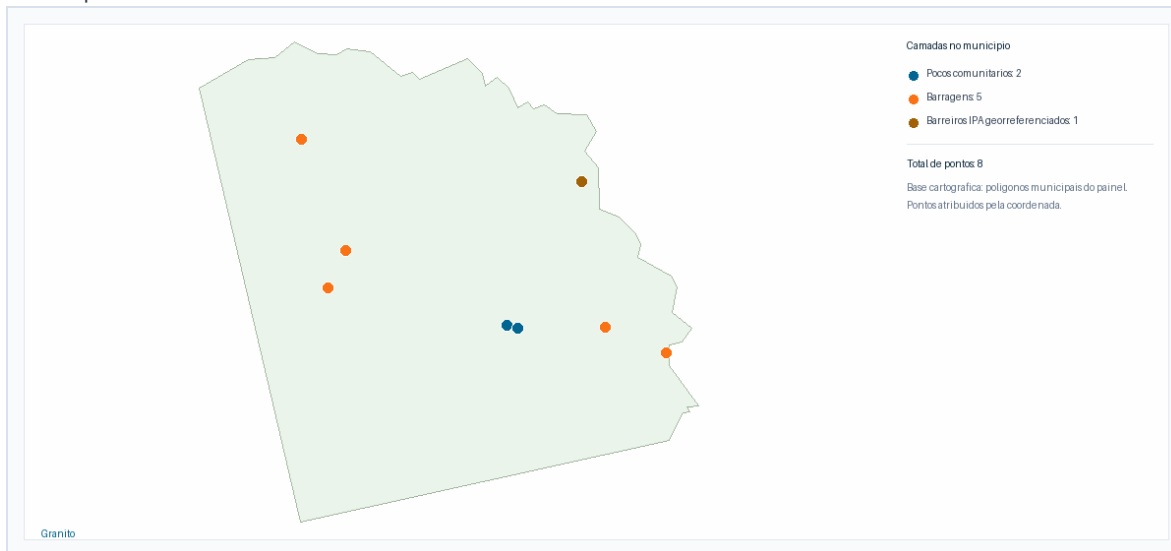

População aglomerada	105	1 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	2	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	2
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	5
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	5 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 11,4 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	2 Pocos comunitários; 5 Barragens

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	5
Concluídas	0
Em execucao	4
Planejadas	1
Investimento municipal	R\$ 11,4 mi
Investimento ativo	R\$ 11,4 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste em Jacaré - Parnamirim. Data: 2026-08-18; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	36.2%
Areas publicadas	9
Abastecimento continuo	1
Areas em rodizio	5
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	3

Padroes observados: Rodizio: 4 dias com agua / 8 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 12 dias sem agua | Rodizio: 3.8 dias com agua / 8.2 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0060	Sistema Adutor de Negreiros para reforço da Adutora do Oeste	Em andamento	5%	Concluir obra 2027-12-01	R\$ 6,1 mi
GPI0277	Ampliação do Sistema Adutor do Oeste	A fazer	0%	Emitir Ordem de Serviço (Obra) 2027-04-02	R\$ 5,1 mi
GPI0195	Substituição de 2,5 Km de Adutora da ETA Luiz Gonzaga para Exu, no município de	Em andamento	93%	Concluir obra 2026-10-15	R\$ 153.039
GPI0225	Requalificação da estação elevatória de captação de água do sistema adutor do Oe	Em andamento	0%	Concluir obra 2026-08-18	R\$ 3.171
GPI0224	Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste	Em andamento	0%	Concluir obra 2026-08-18	R\$ 2.251

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
