


Extrato Municipal - Itaíba

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Itaíba

Mapa do município

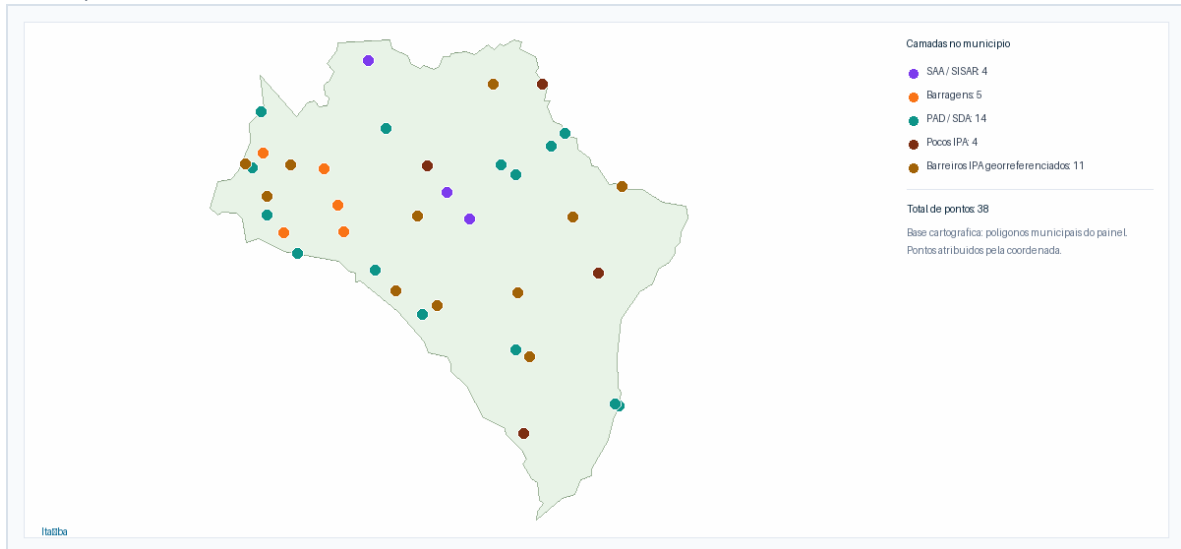

População aglomerada	4.278	27 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	21	Lacuna estimada: 6. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	4
Barragens	5
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	14
PISF / SDA	0
Pocos IPA	5
Barreiros IPA georreferenciados	11

Instituição	Resumo
Compesa	6 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 20,3 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	14 PAD; 0 PISF; 60 aguadas; 142 cisternas
IPA	5 pocos; 3 instalados; 10 barreiros; 0 BPP
SRHS	4 SAA / SISAR; 5 Barragens

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	6
Concluídas	4
Em execucao	2
Planejadas	0
Investimento municipal	R\$ 20,3 mi
Investimento ativo	R\$ 19,0 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Poços de Tupanatinga. Data: 2026-12-09; execucao: 79%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	18.0%
Areas publicadas	23
Abastecimento continuo	0
Areas em rodizio	23
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Abastecimento parcial: 4 dias no mes | Abastecimento parcial: 3 dias no mes | Abastecimento parcial: 11 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0005	Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Poços de Tupanatinga	Em andamento	79%	Concluir obra 2026-12-09	R\$ 13,4 mi
GPI0007	Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 3B (Buíque - Iati)	Em andamento	2%	Concluir obra 2027-05-30	R\$ 5,6 mi
GPI0636	Implantação de subadutora e rede distribuição para as comunidades Angico Torto e	Concluído	100%	- 2023-03-31	R\$ 926.366
GPI0467	Melhorias na rede de distribuição do Povoado Barra Formosa, na zona rural de Ita	Concluído	100%	- 2025-02-14	R\$ 180.000
GPI0373	Realocação da Estação Elevatória de Água Tratada da Comunidade Rural de Manuíno	Concluído	100%	- 2025-10-15	R\$ 100.000

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0533	Melhorias na rede de distribuição do Sítio Melancia, na zona rural de Itaíba (Co	Concluído	100%	- 2024-10-01	R\$ 48.959

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
