


Extrato Municipal - Ouricuri

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Ouricuri

Mapa do município

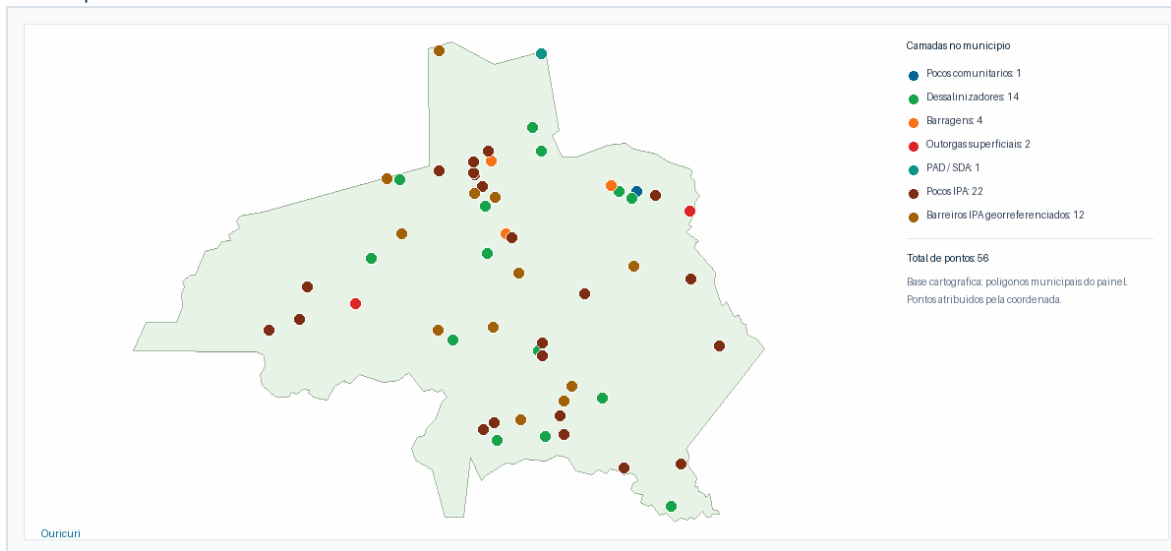

Populacao aglomerada	5.042	19 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	17	Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	0
Dessalinizadores	13
SAA / SISAR	0
Barragens	4
Outorgas subterraneas	0
Outorgas superficiais	2
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	22
Barreiros IPA georreferenciados	12

Instituicao	Resumo
Compesa	7 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 135,9 mi atribuidos; abastecimento: Area em colapso
SDA	0 PAD; 0 PISF; 50 aguadas; 0 cisternas
IPA	24 pocos; 4 instalados; 9 barreiros; 0 BPP
SRHS	13 Dessalinizadores; 4 Barragens; 2 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	7
Concluídas	1
Em execucao	3
Planejadas	3
Investimento municipal	R\$ 135,9 mi
Investimento ativo	R\$ 128,5 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Programa ETAs de Ultrafiltração - Reforço do Ramal III da partir da barragem Algodões.
Data: 2026-07-30; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Area em colapso
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	41.8%
Areas publicadas	38
Abastecimento continuo	0
Areas em rodizio	37
Areas em colapso	1
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 6.6 dias com agua / 7.4 dias sem agua | Rodizio: 6.2 dias com agua / 7.4 dias sem agua | Rodizio: 1.5 dias com agua / 7.5 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0060	Sistema Adutor de Negreiros para reforço da Adutora do Oeste	Em andamento	5%	Concluir obra 2027-12-01	R\$ 57,7 mi
GPI0277	Ampliação do Sistema Adutor do Oeste	A fazer	0%	Emitir Ordem de Serviço (Obra) 2027-04-02	R\$ 47,8 mi
GPI0067	Programa ETAs de Ultrafiltração - Reforço do Ramal III da partir da barragem Alg	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-07-30	R\$ 16,0 mi
GPI0542	Implantação de rede de distribuição para Patos, Cova do Anjo e Canto Alegre - Zo	Concluído	100%	- 2024-09-28	R\$ 7,4 mi
GPI0072	Ampliação da ETA Voluntários da Pátria – Ouricuri - Obras Complementares	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-08-27	R\$ 7,0 mi

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0225	Requalificação da estação elevatória de captação de água do sistema adutor do Oe	Em andamento	0%	Concluir obra 2026-08-18	R\$ 29.808
GPI0224	Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste	Em andamento	0%	Concluir obra 2026-08-18	R\$ 21.159

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
