


Extrato Municipal - Parnamirim

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Parnamirim

Mapa do município

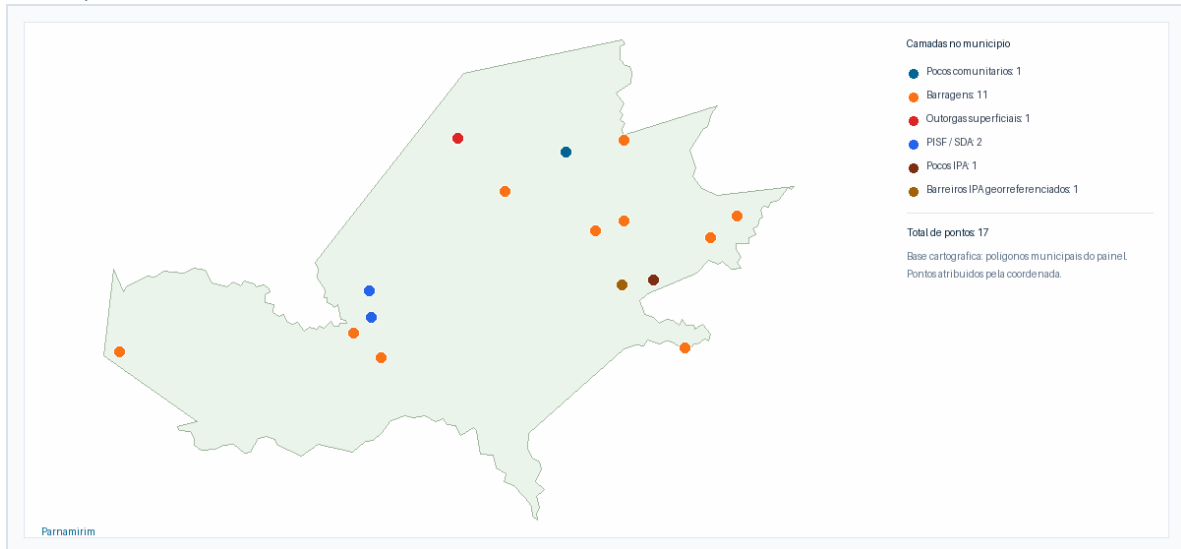

População aglomerada	1.543	7 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	10	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	1
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	11
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	0
PISF / SDA	2
Pocos IPA	1
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	3 iniciativas; 4 projetos KML; R\$ 13,3 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 2 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	31 pocos; 7 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Pocos comunitários; 11 Barragens; 1 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	3
Concluídas	0
Em execucao	3
Planejadas	0
Investimento municipal	R\$ 13,3 mi
Investimento ativo	R\$ 13,3 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste em Jacaré - Parnamirim. Data: 2026-08-18; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	41.2%
Areas publicadas	17
Abastecimento continuo	0
Areas em rodizio	15
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	2

Padroes observados: Rodizio: 4 dias com agua / 3 dias sem agua | Rodizio: 24 h com agua / 2 dias sem agua | Rodizio: 2 dias com agua / 4 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0060	Sistema Adutor de Negreiros para reforço da Adutora do Oeste	Em andamento	5%	Concluir obra 2027-12-01	R\$ 13,3 mi
GPI0225	Requalificação da estação elevatória de captação de água do sistema adutor do Oe	Em andamento	0%	Concluir obra 2026-08-18	R\$ 6.857
GPI0224	Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste	Em andamento	0%	Concluir obra 2026-08-18	R\$ 4.867

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
