


Extrato Municipal - Paulista

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Paulista

Mapa do município

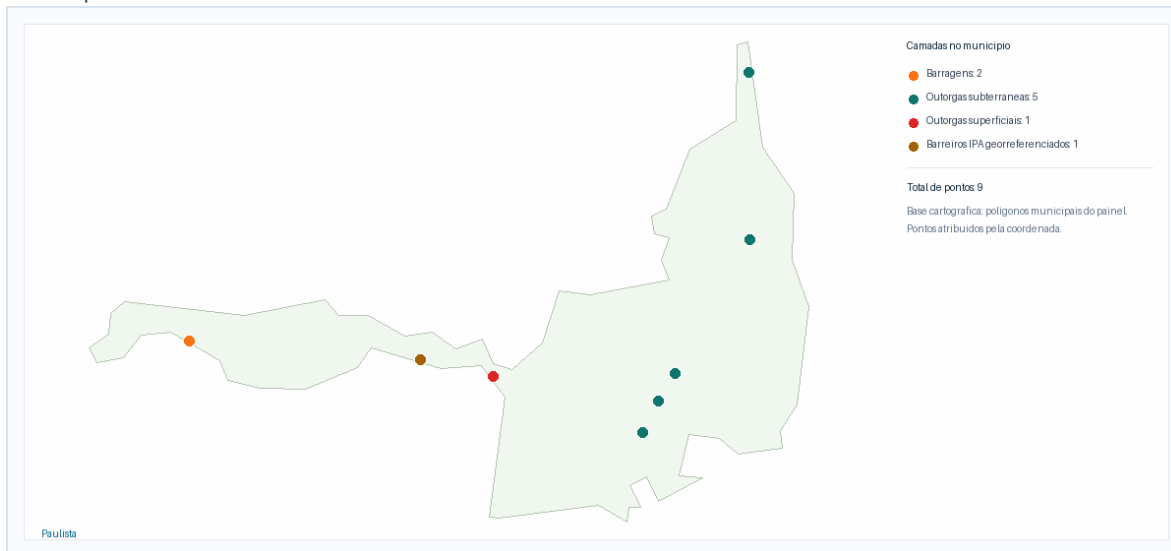

População aglomerada	0	0 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	5	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	1
Outorgas subterrâneas	5
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	0

Instituição	Resumo
Compesa	30 iniciativas; 4 projetos KML; R\$ 531,4 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Barragens; 5 Outorgas subterrâneas; 1 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	30
Concluídas	17
Em execucao	4
Planejadas	9
Investimento municipal	R\$ 531,4 mi
Investimento ativo	R\$ 458,5 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Emitir ordem de serviço - SAA Botafogo - Sistema Adutor do Rio Paratibe até o SP Navarro. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	30.9%
Areas publicadas	160
Abastecimento continuo	18
Areas em rodizio	142
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 2 dias com agua / 6 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 22 h com agua / 7 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0317	SES Paulista	A licitar	0%	- 2031-12-31	R\$ 307,0 mi
GPI0316	SES Olinda	A licitar	0%	- 2030-12-31	R\$ 50,1 mi
GPI0035	Implantação do Sistema Adutor Arataca II	Concluído	100%	- 2026-01-31	R\$ 45,9 mi
GPI0262	SAA Botafogo - Requalificação do Sistema Produtor Botafogo	A elaborar projeto	0%	Publicar edital 2026-08-30	R\$ 35,0 mi
GPI0063	Complementação do SES Paulista - Subsistema Zero	Em licitação	0%	Emitir ordem de serviço 2026-09-30	R\$ 21,7 mi
GPI0162	Poços RMR - Entrega de 6 poços para aumento de vazão de 108 L/s, em Paulista	Concluído	100%	- 2025-12-31	R\$ 18,0 mi

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0263	Poços RMR - Implantação de 25 Poços na RMR	A elaborar projeto	0%	Publicação de edital 2026-08-30	R\$ 15,8 mi
GPI0150	SAA Botafogo - Aquisição e Instalação de ETA 200 L/s em Fibra de Vidro de Parati	A iniciar	0%	Emitir ordem de serviço 2026-08-28	R\$ 5,3 mi
GPI0149	SAA Botafogo - Sistema Adutor do Rio Paratibe até o SP Navarro	A iniciar	0%	Emitir ordem de serviço 2026-08-28	R\$ 4,7 mi
GPI0167	Poços RMR - 1 - Infraestrutura civil para o Poço. 5.8-PI em Paulista/Janga	Em andamento	0%	Concluir obra 2027-01-30	R\$ 4,4 mi
GPI0166	Poços RMR - 1 - Infraestrutura civil para o Poço. 5.7-PI em Paulista/Janga	Em andamento	0%	Concluir obra 2027-01-30	R\$ 4,3 mi
GPI0169	Poços RMR - 1 - Infraestrutura civil para o Poço. 5.10-PI em Paulista/Janga	Em andamento	49%	Concluir obra 2026-12-31	R\$ 3,7 mi
GPI0151	SAA Botafogo - Recuperação da ETA Botafogo	Concluído	100%	- 2026-01-30	R\$ 3,7 mi
GPI0168	Poços RMR - 1 - Infraestrutura civil para o Poço. 5.9-PI em Paulista/Janga	Em andamento	49%	Concluir obra 2026-09-30	R\$ 3,5 mi
GPI0153	SAA Botafogo - Sistema de Bombeamento da EEAB Botafogo I (Catucá)	Concluído	100%	- 2025-03-24	R\$ 3,4 mi
GPI0152	SAA Botafogo - Reabilitação Eletromecânica da ETA Botafogo	Em licitação	0%	Emitir ordem de serviço 2026-08-31	R\$ 2,7 mi
GPI0690	Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água	Concluído	100%	- 2026-06-30	R\$ 793.694
GPI0536	Modernização da rede de abastecimento de água ao longo da Av. Cláudio Gueiros (	Concluído	100%	- 2024-10-01	R\$ 434.190
GPI0036	Implantação do Sistema Adutor Arataca II (Complemento)	A licitar	0%	Publicar edital 2026-08-31	R\$ 305.667
GPI0655	Implantação de rede na rua Árabe Unida – Pau Amarelo	Concluído	100%	- 2023-01-31	R\$ 121.904
GPI0412	Remanejamento de redes nas ruas 7, 8 e 9 - Maranguape II	Concluído	100%	- 2025-06-30	R\$ 112.252
GPI0663	Remanejamento de rede na Rua Veneza - Arthur Lundgren I	Concluído	100%	- 2023-11-30	R\$ 98.836
GPI0511	Remanejamento de redes nas ruas Jardim, Betânia e Mirandiba - Arthur Lundgren I	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 87.136
GPI0656	Implantação de rede na 2ª travessa da rua Doze, Maranguape I	Concluído	100%	- 2023-01-31	R\$ 79.762
GPI0662	Remanejamento de rede na Travessa da Resistência – Arthur Lundgren II	Concluído	100%	- 2023-11-30	R\$ 79.739
GPI0424	Remanejamento de rede na rua Vinte e três - Maranguape I, Paulista	Concluído	100%	- 2025-05-31	R\$ 72.581
GPI0664	Remanejamento de rede na Rua Lagoa - Arthur Lundgren I	Concluído	100%	- 2023-11-30	R\$ 58.416
GPI0584	Remanejamento de rede na Rua Cento e vinte e três - Jardim Paulista	Concluído	100%	- 2024-04-02	R\$ 45.000
GPI0649	Implantação de Rede de Distribuição na Rua Vietnã do Norte em Pau Amarelo - Paul	Concluído	100%	- 2023-01-16	R\$ 18.000
GPI0665	Melhoria do abastecimento do bairro da Aurora	Concluído	100%	- 2023-11-30	R\$ 8.000

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
