


Extrato Municipal - Pedra

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Pedra

Mapa do município

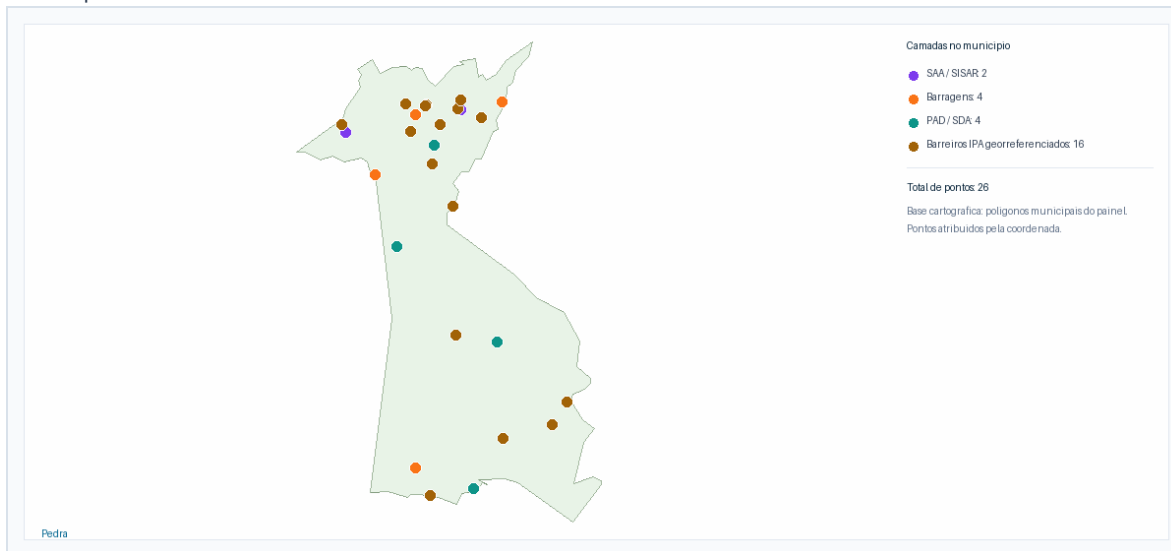

População aglomerada	1.463	5 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	2	Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	2
Barragens	4
Outorgas subterraneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	3
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	16

Instituicao	Resumo
Compesa	4 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 7,7 mi atribuídos; abastecimento: Rodizio
SDA	3 PAD; 0 PISF; 30 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 16 barreiros; 0 BPP
SRHS	2 SAA / SISAR; 4 Barragens

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	4
Concluídas	2
Em execucao	2
Planejadas	0
Investimento municipal	R\$ 7,7 mi
Investimento ativo	R\$ 7,4 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Ampliação da capacidade de Tratamento 29 L/s para 40 L/s da ETA Pedra. Data: 2026-10-30; execucao: 23%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	28.1%
Areas publicadas	10
Abastecimento continuo	0
Areas em rodizio	10
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Abastecimento parcial: 7 dias no mes | Rodizio: 5 dias com agua / 20 dias sem agua | Abastecimento parcial: 5 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0006	Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 2B (Pesqueira e Buíque)	Em andamento	30%	Concluir obra 2027-02-04	R\$ 6,2 mi
GPI0208	Ampliação da capacidade de Tratamento 29 L/s para 40 L/s da ETA Pedra	Em andamento	23%	Concluir obra 2026-10-30	R\$ 1,2 mi
GPI0545	Interligação do sistema produtor Riacho do Pau à adutora do Agreste, em Pedra, p	Concluído	100%	- 2024-09-20	R\$ 207.655
GPI0496	Adequação e Ampliação da Rede Distribuidora de Água da Rua Maria de Lourdes Soar	Concluído	100%	- 2024-12-16	R\$ 121.508

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
