


Extrato Municipal - Santa Maria Do Cambucá

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Santa Maria Do Cambucá

Mapa do municipio

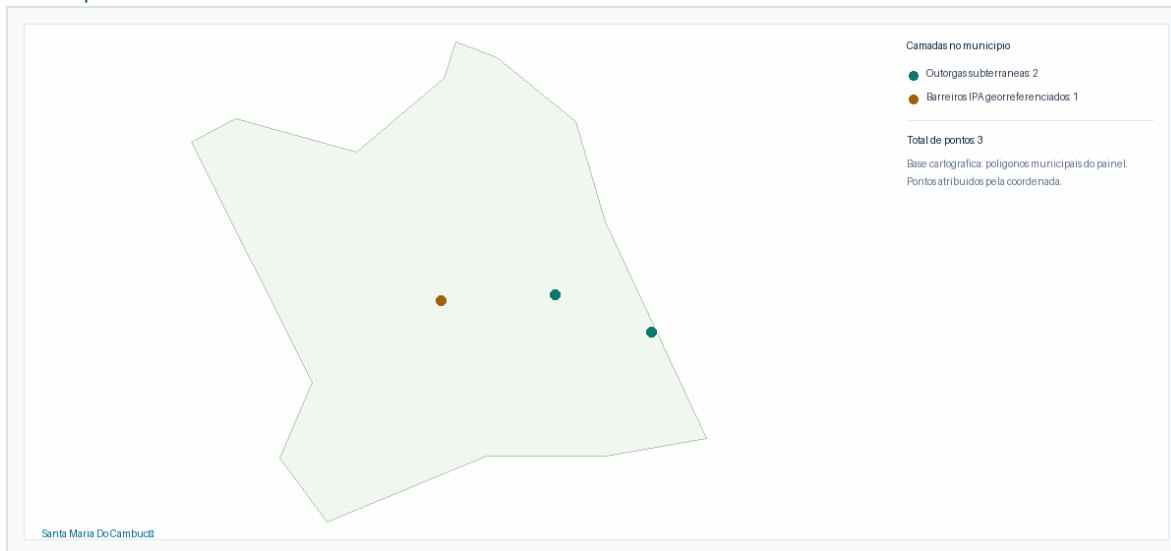

População aglomerada	3.616	14 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	2	Lacuna estimada: 12. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	0
Outorgas subterraneas	2
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituicao	Resumo
Compesa	9 iniciativas; 4 projetos KML; R\$ 24,6 mi atribuídos; abastecimento: Sem calendario publicado
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	2 Outorgas subterraneas

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	9
Concluídas	3
Em execução	1
Planejadas	5
Investimento municipal	R\$ 24,6 mi
Investimento ativo	R\$ 21,7 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restrição explícita

Próxima etapa: Relicitar projeto - 2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Toritama-Casinhas. Data: 2026-08-30; execução: 0%.

Calendário de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referência	2026-08
Situação mais crítica	Sem calendário publicado
Situação predominante	Sem calendário publicado
Cobertura programada ponderada	0.0%
Áreas publicadas	11
Abastecimento contínuo	0
Áreas em rodízio	0
Áreas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendário publicado	11

O padrão de rodízio é estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento são marcações explícitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Próxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0707	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Toritama-Casinhas	A licitar	0%	Relicitar projeto 2026-08-30	R\$ 9,3 mi
GPI0002	Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste Lote 4B ETA Salgado (Caruaru) a Sa	Em andamento	79%	Concluir obra 2026-12-30	R\$ 4,6 mi
GPI0710	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 3,4 mi
GPI0028	Adutora do Alto Capibaribe - 2ª Etapa	Concluído	100%	- 2026-06-26	R\$ 2,8 mi
GPI0709	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 2,6 mi
GPI0111	Programa ETAs de Ultrafiltração - Aquisição de 2 ETAs Jucazinho - 100 L/s	A iniciar	0%	Recebimento da ETA 2027-04-30	R\$ 1,2 mi
GPI0264	Requalificação do Sistema Produtor Jucazinho	A licitar	0%	Publicar edital 2026-09-30	R\$ 614.163

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0444	Interligação Adutora do Agreste a Jucazinho (Trecho Urbano de Caruaru)	Concluído	100%	- 2025-04-06	R\$ 46.245
GPI0180	ETA Dupla Filtração de 200 L/s Bela Vista - Caruaru	Concluído	100%	- 2025-08-31	R\$ 43.861

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
