


Extrato Municipal - Tacaimbó

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Tacaimbó

Mapa do município

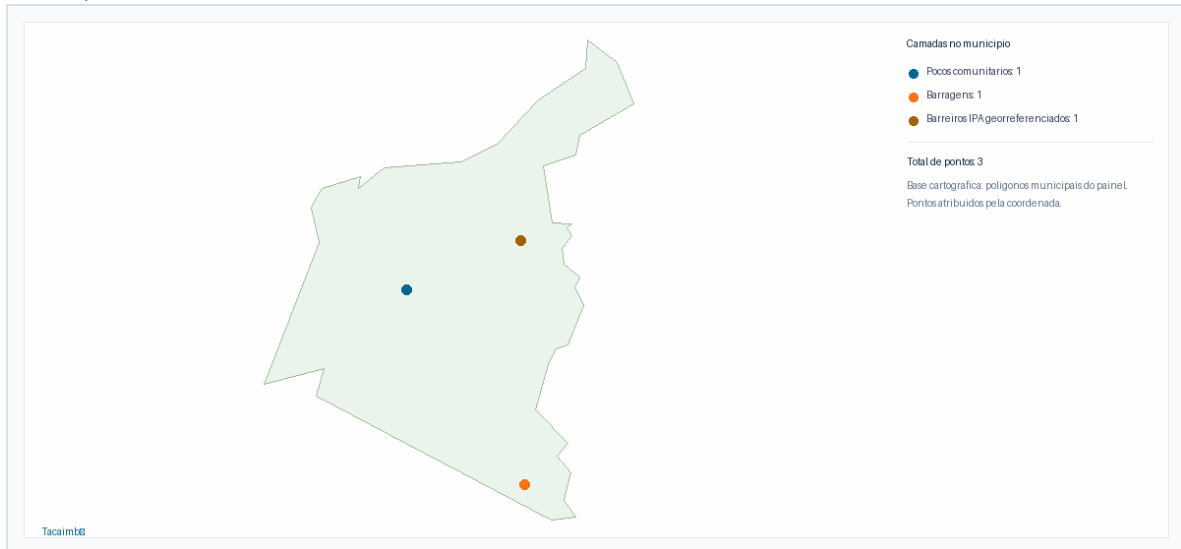

População aglomerada	693	3 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	1	Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	1
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	1
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	6 iniciativas; 6 projetos KML; R\$ 2,2 mi atribuídos; abastecimento: Sem calendário publicado
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 8 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Pocos comunitários; 1 Barragens

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	6
Concluídas	4
Em execucao	1
Planejadas	1
Investimento municipal	R\$ 2,2 mi
Investimento ativo	R\$ 452.623
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Melhoria e Adequação da ETA Manoel Longo e ETA Bitury. Data: 2027-03-19; execucao: 30%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Sem calendario publicado
Situacao predominante	Abastecimento continuo
Cobertura programada ponderada	100.0%
Areas publicadas	14
Abastecimento continuo	10
Areas em rodizio	0
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	4

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0001	Estação Elevatória de Água Bruta da 1ª etapa da Adutora do Sistema Adutor do Agr	Concluído	100%	- 2024-02-29	R\$ 1,6 mi
GPI0286	Recuperação da barragem Serro Azul + implantação do plano de emergência	A licitar	0%	- 2028-04-28	R\$ 272.028
GPI0202	Melhoria e Adequação da ETA Manoel Longo e ETA Bitury	Em andamento	30%	Concluir obra 2027-03-19	R\$ 180.595
GPI0599	Laboratório Belo Jardim	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 63.639
GPI0359	Implantação da Captação Emergencial Barragem de Góis - PISF	Concluído	100%	- 2025-12-12	R\$ 60.656
GPI0627	Execução de Canal de Água Floculada ETA Bitury	Concluído	100%	- 2023-05-16	R\$ 1.960

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
