


Extrato Municipal - Alagoinha

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Alagoinha

Mapa do município

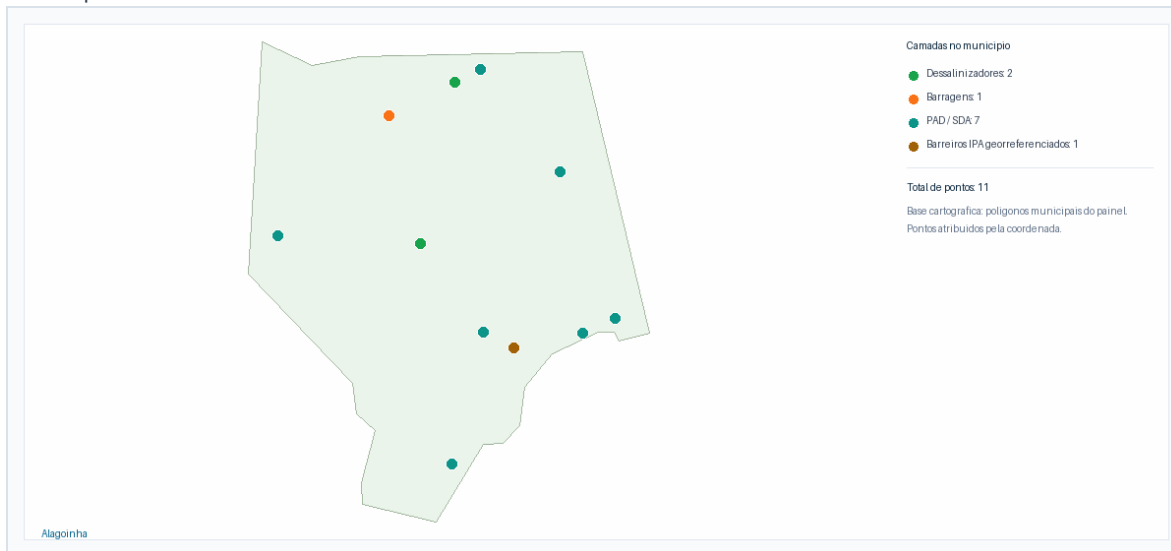

População aglomerada	2.414	13 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	9	Lacuna estimada: 4. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	0
Dessalinizadores	3
SAA / SISAR	0
Barragens	1
Outorgas subterraneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	7
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituicao	Resumo
Compesa	4 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 6,7 mi atribuídos ao município
SDA	7 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	3 Dessalinizadores; 1 Barragens

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	4
Concluídas	3
Em execucao	1
Planejadas	0
Investimento municipal	R\$ 6,7 mi
Investimento ativo	R\$ 4,1 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 2B (Pesqueira e Buíque). Data: 2027-02-04; execucao: 30%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0006	Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 2B (Pesqueira e Buíque)	Em andamento	30%	Concluir obra 2027-02-04	R\$ 4,1 mi
GPI0001	Estação Elevatória de Água Bruta da 1ª etapa da Adutora do Sistema Adutor do Agr	Concluído	100%	- 2024-02-29	R\$ 1,3 mi
GPI0600	Implantação de ETA de Ultrafiltração para ampliação do abastecimento de Pesqueir	Concluído	100%	- 2023-12-20	R\$ 1,2 mi
GPI0599	Laboratório Belo Jardim	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 52.651

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
