


Extrato Municipal - Caruaru

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Caruaru

Mapa do município

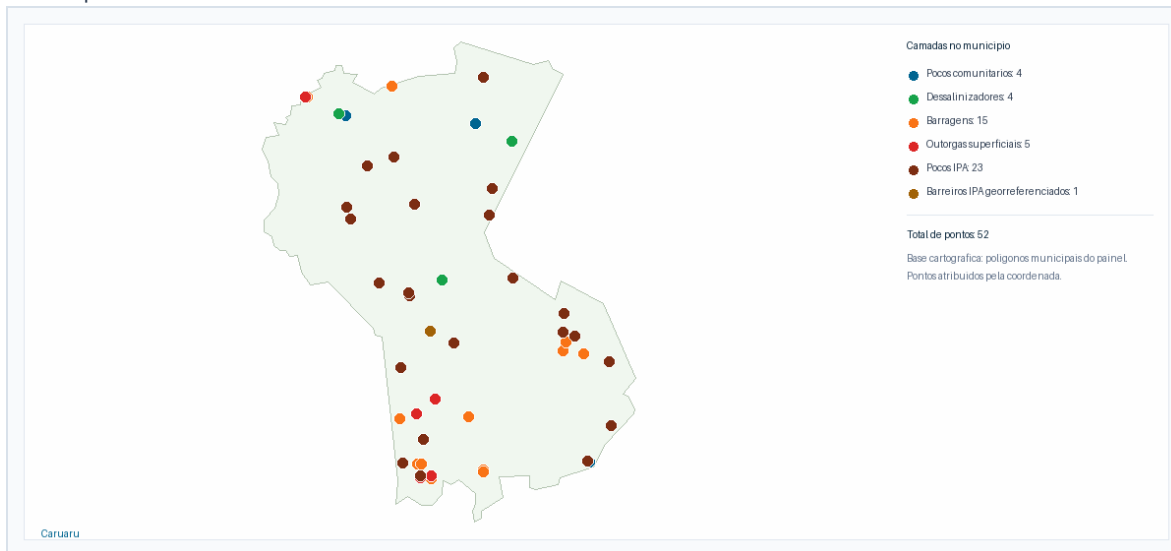

População aglomerada	14.390	60 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	11	Lacuna estimada: 49. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	4
Dessalinizadores	3
SAA / SISAR	0
Barragens	14
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	5
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	27
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	32 iniciativas; 14 projetos KML; R\$ 444,9 mi atribuídos ao município
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	27 pocos; 4 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	4 Pocos comunitários; 3 Dessalinizadores; 14 Barragens; 5 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	32
Concluídas	19
Em execucao	6
Planejadas	7
Investimento municipal	R\$ 444,9 mi
Investimento ativo	R\$ 350,3 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Implantação de ETEF na ETA Salgado. Data: 2026-07-31; execucao: 100%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0244	Implantação e modernização do sistema de distribuição da cidade de Caruaru	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-09-30	R\$ 141,1 mi
GPI0001	Estação Elevatória de Água Bruta da 1ª etapa da Adutora do Sistema Adutor do Agr	Concluído	100%	- 2024-02-29	R\$ 72,1 mi
GPI0264	Requalificação do Sistema Produtor Jucazinho	A licitar	0%	Publicar edital 2026-09-30	R\$ 55,2 mi
GPI0266	Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior (Agreste e Matas)	A licitar	0%	Publicar edital 2026-09-30	R\$ 40,3 mi
GPI0050	Implantação do SES Alto do Moura - Complementação	Em andamento	72%	Concluir obra 2027-09-17	R\$ 38,0 mi
GPI0246	Implantação do SAA da Zona Rural de Caruaru e Riacho das Almas, Sítio Serra Verd	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-10-01	R\$ 16,3 mi
GPI0250	Implantação de rede de distribuição nas Áreas do 4º Distrito, Caruaru	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 15,1 mi
GPI0064	Ampliação do SES Rendeiras, implantação do Coletor 24 e Construção da Estação EI	Em licitação	0%	Emitir ordem de serviço 2026-09-30	R\$ 12,4 mi
GPI0286	Recuperação da barragem Serro Azul + implantação do plano de emergência	A licitar	0%	- 2028-04-28	R\$ 12,4 mi
GPI0003	Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 5B (Caruaru - Gravatá)	Em andamento	74%	Concluir obra 2026-12-07	R\$ 9,8 mi
GPI0201	Melhoria da ETA Salgado para recebimento da Adutora do Agreste	Em andamento	0%	Concluir obra 2027-03-30	R\$ 5,3 mi
GPI0444	Interligação Adutora do Agreste a Jucazinho (Trecho Urbano de Caruaru)	Concluído	100%	- 2025-04-06	R\$ 4,2 mi
GPI0180	ETA Dupla Filtração de 200 L/s Bela Vista - Caruaru	Concluído	100%	- 2025-08-31	R\$ 3,9 mi
GPI0039	Implantação de ETEF na ETA Salgado	Em andamento	100%	Concluir obra 2026-07-31	R\$ 3,5 mi
GPI0393	Implantação da adutora de distribuição para alimentação da Zona Oeste (Parceria	Concluído	100%	- 2025-08-31	R\$ 3,1 mi
GPI0359	Implantação da Captação Emergencial Barragem de Góis - PISF	Concluído	100%	- 2025-12-12	R\$ 2,8 mi

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0587	Ramal adutora do agreste para ETA Petrópolis	Concluído	100%	- 2024-03-09	R\$ 2,0 mi
GPI0597	Abastecimento de Itaúna através da adutora do Agreste	Concluído	100%	- 2024-02-29	R\$ 2,0 mi
GPI0234	Implantação de rede de água para o Bairro Universitário em Caruaru	Concluído	100%	- 2026-04-29	R\$ 932.341
GPI0519	Melhoria e implantação de Adutora para Abastecimento do Sítio Contendas e Vila d	Concluído	100%	- 2024-11-01	R\$ 850.000
GPI0221	Implantação de Rede para Reativação da Adutora de Água Bruta de Tabocas para Car	Em andamento	80%	Concluir obra 2026-08-30	R\$ 601.954
GPI0582	Implantação de Rede de Distribuição de Água no Loteamento Amilson Afonso	Concluído	100%	- 2024-04-15	R\$ 514.701
GPI0640	Requalificação do Sistema de Reuso de Efluentes da ETE Rendeiras (Caruaru)	Concluído	100%	- 2023-03-24	R\$ 493.985
GPI0355	Implantação da rede de distribuição do Loteamento Copacabana no bairro Cidade Ja	Concluído	100%	- 2026-01-05	R\$ 420.616
GPI0501	Extensão de rede de distribuição de água no adensado Sítio Torres	Concluído	100%	- 2025-02-25	R\$ 409.530
GPI0644	Implantação de Rede de Distribuição de Água para Loteamentos Serranópolis e Luiz	Concluído	100%	- 2023-03-17	R\$ 332.618
GPI0241	Estação de Tratamento de Esgoto Che Guevara	Em andamento	80%	Concluir obra 2026-09-30	R\$ 316.136
GPI0629	Implantação do SAA Carapotós e SAA Lagoa Roçada	Concluído	100%	- 2023-04-30	R\$ 235.583
GPI0356	Estação elevatória de Água Tratada de Riacho Doce	Concluído	100%	- 2025-12-29	R\$ 110.000
GPI0547	Recuperação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Vila do Rafael	Concluído	100%	- 2024-08-31	R\$ 104.000
GPI0240	Ampliação da oferta de água para Pé de Serra de Lajes, em Caruaru	Concluído	100%	- 2024-09-30	R\$ 60.000
GPI0352	Extensão de Rede de Abastecimento para o Autódromo de Caruaru	Concluído	100%	- 2026-02-05	R\$ 57.606

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.
