


Extrato Municipal - Moreno

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Moreno

Mapa do município

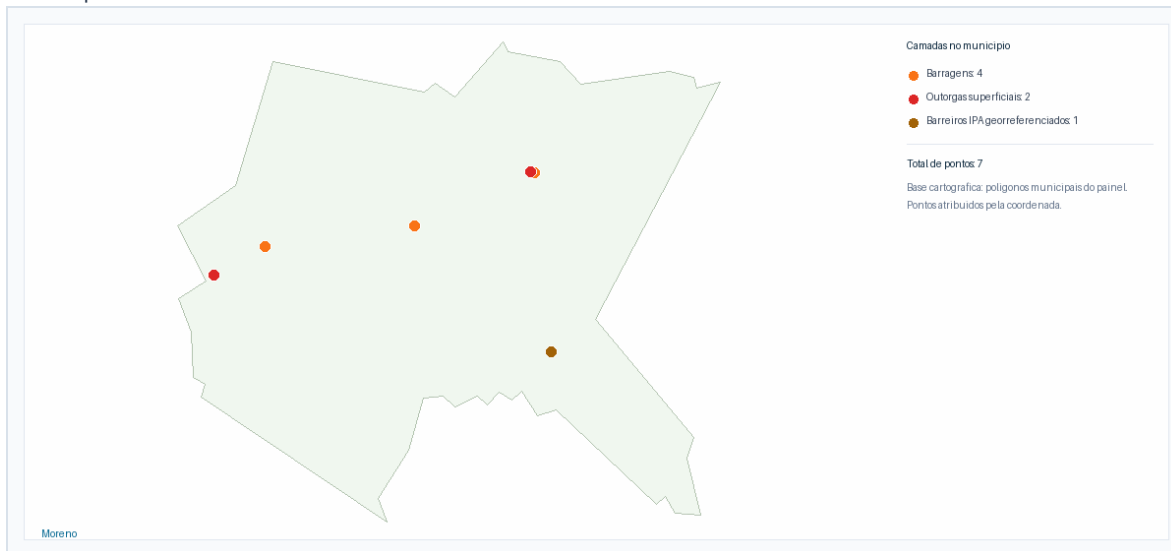

População aglomerada	691	2 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 2. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	4
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	2
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	12 iniciativas; 4 projetos KML; R\$ 83,9 mi atribuídos ao município
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	4 Barragens; 2 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	12
Concluídas	5
Em execução	4
Planejadas	3
Investimento municipal	R\$ 83,9 mi
Investimento ativo	R\$ 83,7 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restrição explícita

Próxima etapa: Publicar edital de licitação do projeto - Ampliação do Sistema Produtor de Moreno e Jaboatão dos Guararapes a partir da Barragem de Engenho Pereira. Data: 2026-08-31; execução: 0%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Próxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0309	SES Bonança	A licitar	0%	- 2029-12-31	R\$ 20,0 mi
GPI0314	SES Moreno 1	A licitar	0%	- 2029-12-31	R\$ 20,0 mi
GPI0124	Programa ETAs de Ultrafiltração - Instalação de ETA ultra filtração 50 L/s no mu	Em andamento	65%	Concluir obra 2026-08-31	R\$ 12,5 mi
GPI0059	Construção da Barragem Engenho Pereira	Em andamento	58%	Concluir Obra 2027-08-16	R\$ 11,6 mi
GPI0125	Programa ETAs de Ultrafiltração - Requalificação da ETA Bonança	Em andamento	0%	Concluir obra 2026-12-31	R\$ 11,4 mi
GPI0084	Ampliação do Sistema Produtor de Moreno e Jaboatão dos Guararapes a partir da Ba	A licitar	0%	Publicar edital de licitação do projeto 2026-08-31	R\$ 7,1 mi
GPI0197	Retrofit de instalações elétricas e equipamentos eletromecânicos da ETA Moreno	Em andamento	0%	Concluir obra 2026-10-31	R\$ 1,2 mi
GPI0658	Substituição de 240m rede que estava aparente	Concluído	100%	- 2023-01-31	R\$ 59.389
GPI0657	Implantação de 162m de rede que ficou sob o prédio da Escola Técnica	Concluído	100%	- 2023-01-31	R\$ 39.918
GPI0688	Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água	Concluído	100%	- 2026-06-30	R\$ 15.948
GPI0422	Assentamento de 60m de rede para melhoria no abastecimento	Concluído	100%	- 2025-06-30	R\$ 7.931
GPI0525	Substituição de 150m de rede com vazamento sob escadaria	Concluído	100%	- 2024-10-30	R\$ 5.759

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.
