


Extrato Municipal - Recife

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Recife

Mapa do município

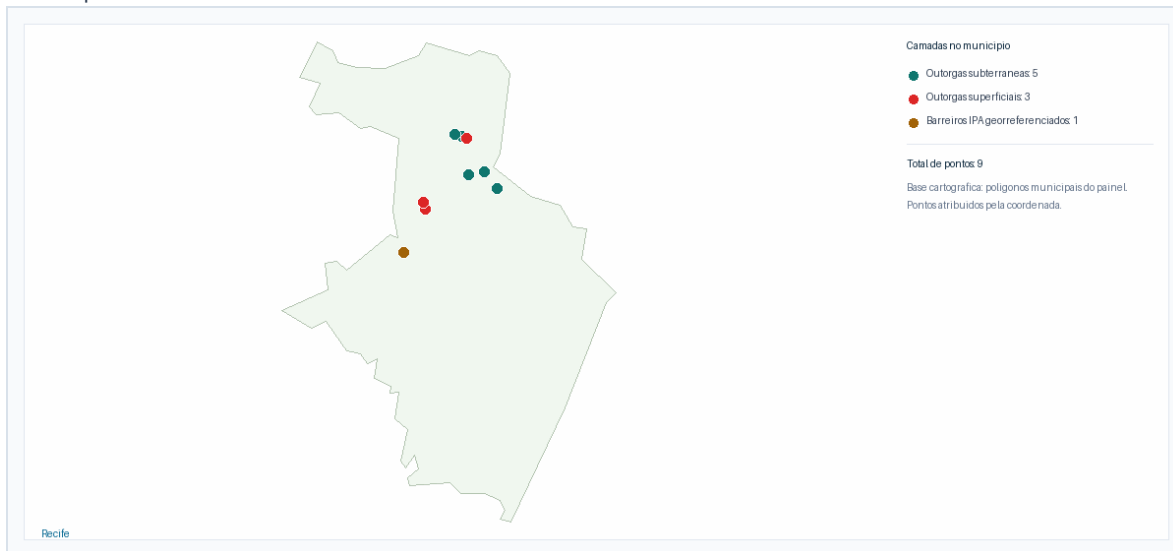

Populacao aglomerada	0	0 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	5	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada.
Decreto de estiagem	Nao	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	0
Outorgas subterraneas	5
Outorgas superficiais	3
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	2

Instituicao	Resumo
Compesa	132 iniciativas; 6 projetos KML; R\$ 1,3 bi atribuidos ao municipio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	5 Outorgas subterraneas; 3 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	132
Concluídas	105
Em execucao	11
Planejadas	16
Investimento municipal	R\$ 1,3 bi
Investimento ativo	R\$ 1,2 bi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Poços RMR - 1- Poço em Bomba do Hemetério (Poço Jacyara 2). Data: 2026-07-31; execucao: 86%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0304	SES Várzea (1ª Etapa útil - SES Camaragibe)	A iniciar	0%	Emitir ordem de serviço 2026-08-30	R\$ 257,0 mi
GPI0310	SES Cabanga	A licitar	0%	- 2030-12-31	R\$ 140,0 mi
GPI0261	SAA Tapacurá - Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-30	R\$ 116,0 mi
GPI0048	Implantação do SES Boa Viagem / Pina	Em andamento	9%	Concluir obra 2027-05-17	R\$ 74,5 mi
GPI0073	SES Setúbal	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-10-30	R\$ 60,5 mi
GPI0289	SES Cabanga - 2ª Etapa Útil (Pina, Mustardinha, Afogados, San Martin e Prado)	Concluído	100%	- 2026-06-30	R\$ 60,0 mi
GPI0313	SES Minerva	A licitar	0%	- 2030-12-31	R\$ 56,0 mi
GPI0311	SES Cordeiro	A licitar	0%	- 2030-12-31	R\$ 55,0 mi
GPI0284	Recuperação da barragem Pirapama	A licitar	0%	- 2028-12-29	R\$ 48,5 mi
GPI0041	Ampliação do SAA dos Morros da Zona Norte	Em andamento	48%	Concluir obra 2027-01-26	R\$ 47,5 mi
GPI0056	Conclusão da Adutora do Ibura	A retomar	91%	Retomar obra 2027-01-02	R\$ 37,4 mi
GPI0271	Requalificação da Estação de Tratamento de Efluentes Pirapama	A licitar	0%	Publicar edital 2026-08-30	R\$ 28,8 mi
GPI0045	Complementação Duplicação da Alça Norte - Grandes Anéis Lote VI	Em andamento	16%	Concluir obra 2027-02-19	R\$ 28,1 mi
GPI0318	SES Peixinhos	A licitar	0%	- 2029-12-31	R\$ 28,0 mi
GPI0307	SES Cabanga - SES Entra Apulso	Em andamento	0%	Concluir obra 2027-02-20	R\$ 26,0 mi
GPI0290	SES Cabanga - 2ª Etapa Útil (Bongi e Mustardinha)	A iniciar	0%	Concluir obra 2027-09-30	R\$ 26,0 mi
GPI0308	SES EEX-04 (Relocação EE TCE)	A iniciar	0%	Emitir ordem de serviço 2026-08-30	R\$ 21,0 mi
GPI0074	SES Cordeiro (Rede Coletora Bacia 41A)	A iniciar	0%	Emitir ordem de serviço 2026-08-31	R\$ 17,9 mi

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0305	SES Peixinhos (2ª Etapa Parcial)	Em andamento	0%	Concluir obra 2028-12-20	R\$ 17,0 mi
GPI0161	Poços RMR - 5 - Entrega dos poços Córrego do Tiro IV, V e VI e Córrego da Fortun	Em andamento	80%	Concluir obra 2026-12-30	R\$ 13,0 mi
GPI0156	SAA Pirapama - Aquisição e Instalação do Eletrocentro - EEAB Pirapama	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-28	R\$ 11,0 mi
GPI0209	Remanejamento de trechos de adutora DN 400 e 500mm e requalificação da EEAB Caix	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-28	R\$ 10,7 mi
GPI0450	Funcionalidade da 1ª etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Cabanga	Concluído	100%	- 2025-03-10	R\$ 10,0 mi
GPI0571	Recuperação da Linha de Recalque do SES do Teatro Santa Isabel	Concluído	100%	- 2024-06-14	R\$ 10,0 mi
GPI0188	SAA Tapacurá - Retrofit dos filtros da ETA Castelo Branco	Em andamento	62%	Concluir obra 2026-09-21	R\$ 9,5 mi
GPI0154	SAA Pirapama - Retrofit da ETA Pirapama	Em andamento	84%	Concluir obra 2026-09-14	R\$ 7,8 mi
GPI0691	Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água	Concluído	100%	- 2026-06-30	R\$ 7,2 mi
GPI0061	SES Imbiribeira (Obra complementar)	A iniciar	0%	Emitir ordem de serviço 2026-09-30	R\$ 7,0 mi
GPI0531	Reforço Estrutural do Centro de Reservaão do Alto da Esperança	Concluído	100%	- 2024-10-18	R\$ 5,0 mi
GPI0601	SES Encanta Moça (Execução de Sistema de Esgotamento Sanitário do Parque Aeroclu	Concluído	100%	- 2023-11-17	R\$ 3,7 mi
GPI0065	SES Dois Unidos (Complementação EEE da UE-03)	A iniciar	0%	Emitir ordem de serviço 2026-09-30	R\$ 3,0 mi
GPI0595	Implantação da Rede de Distribuição de Água do Bairro Novo Recife - Lote II	Concluído	100%	- 2024-01-03	R\$ 2,5 mi
GPI0157	SAA Pirapama - Retrofit da Estação Elevatória - EEAB Pirapama	Em andamento	0%	Concluir obra 2027-04-04	R\$ 2,4 mi
GPI0528	Implantação de linha de reforço a partir da adutora do Bairro Novo Recife - bair	Concluído	100%	- 2024-10-28	R\$ 1,3 mi
GPI0163	Poços RMR - 1- Poço em Bomba do Hemetério (Poço Jacara 2)	Em andamento	86%	Concluir obra 2026-07-31	R\$ 1,3 mi
GPI0181	Retrofit Sistema Alto do Céu - Reativação de Stand-Pipe na adutora de Água Bruta	Concluído	100%	- 2026-01-28	R\$ 1,3 mi
GPI0602	Implantação das Válvulas Redutoras de Pressão dos Distritos 22A, 22B e 44A da GN	Concluído	100%	- 2023-10-30	R\$ 776.960
GPI0408	Retrofit Sistema Alto do Céu - Contenção de encosta próximo ao stand pipe da adu	Concluído	100%	- 2025-07-21	R\$ 674.569
GPI0556	Substituição de rede para melhoria do abastecimento da Comunidade de Brasília Te	Concluído	100%	- 2024-08-09	R\$ 671.385
GPI0512	Modernização da infraestrutura de rede de abastecimento de água da Comunidade da	Concluído	100%	- 2024-11-22	R\$ 659.266

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0367	Assentamento de 4.758m de rede para melhoria no abastecimento e redução de perda	Concluído	100%	- 2025-11-14	R\$ 521.333
GPI0362	Substituição de rede para melhoria do abastecimento da Comunidade do Bode	Concluído	100%	- 2025-12-04	R\$ 466.389
GPI0464	Melhoria de abastecimento de água do Conjunto Habitacional do Cordeiro/Hospital	Concluído	100%	- 2025-02-27	R\$ 387.862
GPI0568	Reinauguração Loja Largo da Paz	Concluído	100%	- 2024-06-30	R\$ 350.000
GPI0615	Instalação de medidores de vazão nos distritos da GNM Centro	Concluído	100%	- 2023-07-31	R\$ 339.457
GPI0413	Adutora Bola na Rede	Concluído	100%	- 2025-06-30	R\$ 188.109
GPI0417	Substituição de 1.020m de rede devido a vazamentos frequentes em 5 ruas	Concluído	100%	- 2025-06-30	R\$ 125.541
GPI0432	Substituição de rede de distribuição da rua Odilon Araújo, Iputinga	Concluído	100%	- 2025-05-01	R\$ 94.114
GPI0437	Substituição de rede de distribuição de água DN 100mm na rua Jayme Loyo, Casa Fo	Concluído	100%	- 2025-04-30	R\$ 59.571
GPI0404	Rebaixamento de redes de distribuição de 100 e 60mm na rua rio Botafogo, Bola na	Concluído	100%	- 2025-07-31	R\$ 58.724
GPI0434	Substituição de rede, dentro do imóvel, na rua Hidelbrando de Vasconcelos, Dois	Concluído	100%	- 2025-04-30	R\$ 54.619
GPI0578	Substituição de 150m de rede com vazamento em barreira	Concluído	100%	- 2024-04-30	R\$ 52.027
GPI0632	Substituição de 183m de rede devido vazamentos frequentes	Concluído	100%	- 2023-04-30	R\$ 49.001
GPI0586	Substituição de trecho de rede de distribuição DN 400mm na rua Erundina de Negre	Concluído	100%	- 2024-03-31	R\$ 48.785
GPI0589	Substituição de trecho de rede de distribuição DN 400mm na rua Erundina de Negre	Concluído	100%	- 2024-02-28	R\$ 48.677
GPI0522	Remanejamento de rede de distribuição DN 60mm, na Rua Alvares Pires, Cordeiro	Concluído	100%	- 2024-10-31	R\$ 45.479
GPI0391	Substituição de 200m de rede devido vazamento sob os imóveis	Concluído	100%	- 2025-08-31	R\$ 35.825
GPI0439	Remanejamento de rede de distribuição da rua Santana de Mangueira - Iputinga	Concluído	100%	- 2025-04-30	R\$ 35.627
GPI0506	Remanejamento de rede de distribuição de água DN 63mm na Rua Morro da Conceição	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 34.299
GPI0549	Substituição de rede de distribuição de água DN 100mm para 2 redes de 63mm, devi	Concluído	100%	- 2024-08-30	R\$ 34.128
GPI0399	Substituição de rede de distribuição de água DN 100mm na rua Padre Antônio Lagre	Concluído	100%	- 2025-07-31	R\$ 33.704
GPI0507	Substituição de 384m de rede devido vazamentos frequentes	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 33.524
GPI0576	Instalação de ramal para a ecoestação, av da Recuperação - Córrego do Jenipapo	Concluído	100%	- 2024-04-30	R\$ 32.393

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0455	Construção de bloco de ancoragem na rede DN 500mm, no Vasco da Gama	Concluído	100%	- 2025-02-28	R\$ 29.684
GPI0523	Remanejamento e substituição de rede de distribuição de água DN 32 mm para DN 63	Concluído	100%	- 2024-10-30	R\$ 29.144
GPI0592	Implantação de rede de água DN 100mm na rua dos Anjos, Água Fria	Concluído	100%	- 2024-02-28	R\$ 26.820
GPI0560	Assentamento de rede para instalação de ramal, na Rua Prof. José dos Anjos, Arru	Concluído	100%	- 2024-07-31	R\$ 26.366
GPI0418	Substituição de 232m de rede devido vazamentos frequentes	Concluído	100%	- 2025-06-30	R\$ 26.113
GPI0426	Substituição de 228m de rede devido vazamentos frequentes	Concluído	100%	- 2025-05-31	R\$ 24.440
GPI0477	Substituição de rede de distribuição DN 32 rua alto José Idalino	Concluído	100%	- 2025-01-31	R\$ 24.228
GPI0492	Substituição de 108m rede devido vazamentos frequentes	Concluído	100%	- 2024-12-30	R\$ 24.021
GPI0383	Substituição de rede de distribuição de 50mm para 63 e 32mm na rua Vargem Linda,	Concluído	100%	- 2025-08-31	R\$ 23.355
GPI0539	Substituição de rede de distribuição DN 100mm na rua Prof José dos Anjos, Mangab	Concluído	100%	- 2024-09-30	R\$ 22.059
GPI0457	Substituição de rede de distribuição DN 60mm, na rua Cassilândia, Várzea	Concluído	100%	- 2025-02-28	R\$ 19.047
GPI0559	Substituição de rede de distribuição de água DN 100mm para 2 redes de 63mm, devi	Concluído	100%	- 2024-07-31	R\$ 15.417
GPI0386	Capeamento de rede de distribuição na avenida Norte e canal do Arruda	Concluído	100%	- 2025-08-31	R\$ 15.305
GPI0476	Substituição de rede de distribuição DN 32, na rua Erundina de Negreiros	Concluído	100%	- 2025-01-31	R\$ 14.924
GPI0445	Interligação de rede de distribuição do poço à comunidade Bola na Rede, Guabirab	Concluído	100%	- 2025-03-30	R\$ 14.706
GPI0509	Substituição de 150m de rede que estava com vazamento sob as casas	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 14.648
GPI0577	Remanejamento de rede de distribuição de água DN 150mm, na rua Prof. Joaquim Cav	Concluído	100%	- 2024-04-30	R\$ 14.431
GPI0638	Assentamento de 66m rede	Concluído	100%	- 2023-03-31	R\$ 14.206
GPI0436	Interligação de rede na estrada das Ubaías	Concluído	100%	- 2025-04-30	R\$ 13.741
GPI0508	Substituição de 256m de rede devido vazamentos frequentes	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 13.479
GPI0403	Assentamento de rede de distribuição dn 63mm da rua Piauí, Poço da Panela	Concluído	100%	- 2025-07-31	R\$ 13.432
GPI0400	Substituição de trecho de rede de distribuição na rua Cosme Bezerra com a rua Bo	Concluído	100%	- 2025-07-31	R\$ 13.411
GPI0387	Adequação da descarga de Dois Irmãos	Concluído	100%	- 2025-08-31	R\$ 13.383
GPI0487	Substituição de rede de distribuição DN 75mm da Rua Antônio Nogueira, Várzea	Concluído	100%	- 2024-12-30	R\$ 13.144

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0505	Remanejamento de rede de distribuição DN 20mm na Rua Piraju, Nova Descoberta	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 13.027
GPI0390	Rebaixamento de rede de distribuição de água na rua Dois de Fevereiro, Vasco da	Concluído	100%	- 2025-08-31	R\$ 12.938
GPI0419	Substituição de 132m de rede devido vazamentos frequentes	Concluído	100%	- 2025-06-30	R\$ 12.567
GPI0382	Remanejamento de rede de distribuição na rua Divisópolis, Dois Unidos	Concluído	100%	- 2025-08-31	R\$ 11.099
GPI0503	Remanejamento de rede de distribuição 63mm na Rua Maria Estevão, Dois Unidos	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 10.765
GPI0447	Assentamento de rede de distribuição de água DN 32 mm, na rua Ayrton Sena, Macax	Concluído	100%	- 2025-03-30	R\$ 10.541
GPI0524	Substituição de 108m rede	Concluído	100%	- 2024-10-30	R\$ 10.243
GPI0540	Substituição de 212m de rede devido a vazamentos frequentes	Concluído	100%	- 2024-09-30	R\$ 9.867
GPI0456	Substituição de rede de 75mm na rua Capilé, Campos Grande	Concluído	100%	- 2025-02-28	R\$ 8.817
GPI0475	Substituição de rede de distribuição DN 32, na rua Monsenhor Viana, Dois Unidos	Concluído	100%	- 2025-01-31	R\$ 7.721
GPI0398	Substituição de trecho de rede de distribuição na avenida Camarões, Iputinga	Concluído	100%	- 2025-07-31	R\$ 7.132
GPI0459	Substituição de rede de distribuição na rua Pedro Toledo	Concluído	100%	- 2025-02-28	R\$ 6.840
GPI0438	Substituição de rede de distribuição de água na rua Prudente de Moraes, Campo Gr	Concluído	100%	- 2025-04-30	R\$ 6.774
GPI0591	Assentamento e interligação de rede DN 200 mm - reservatório Esperança	Concluído	100%	- 2024-02-28	R\$ 6.508
GPI0483	Substituição de rede de distribuição DN 100mm da rua Pedro Ernesto, Várzea	Concluído	100%	- 2025-01-05	R\$ 6.419
GPI0425	Remanejamento de rede de distribuição de água na rua Senador Firmino, Brejo da G	Concluído	100%	- 2025-05-31	R\$ 6.197
GPI0458	Remanejamento de rede de distribuição ND 32mm na rua Ester, Macaxeira	Concluído	100%	- 2025-02-28	R\$ 5.957
GPI0478	Substituição de rede de distribuição DN 100 na rua Claudio Brotherhood	Concluído	100%	- 2025-01-31	R\$ 5.768
GPI0388	Capeamento de rede de distribuição DN 500mm na rua Lopo Garro, Engenho do Meio	Concluído	100%	- 2025-08-31	R\$ 5.706
GPI0504	Substituição de rede de distribuição dn 32mm na subida Olho d'água, Nova Descobe	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 5.680
GPI0402	Substituição de rede de distribuição de água, DN 32mm da rua Mira Santa	Concluído	100%	- 2025-07-31	R\$ 5.647
GPI0550	Substituição de 100m de rede devido vazamentos frequentes	Concluído	100%	- 2024-08-30	R\$ 5.472
GPI0537	Readequação da caixa da válvula de manobra central de progresso, na rua Alto San	Concluído	100%	- 2024-09-30	R\$ 5.277

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0446	Adequação de caixa de registro de manobra DN 300mm na rua Vasco da Gama	Concluído	100%	- 2025-03-30	R\$ 5.187
GPI0593	Instalação de registros de manobra nas ruas Ergas Muniz e Manoel Lopes, Água Fri	Concluído	100%	- 2024-02-28	R\$ 5.168
GPI0435	Interligação de rede de distribuição na estrada da Mumbeca, Bola na Rede	Concluído	100%	- 2025-04-30	R\$ 5.160
GPI0454	Substituição de rede na rua Izaltino Lobo - Linha do Tiro	Concluído	100%	- 2025-02-28	R\$ 4.653
GPI0590	Assentamento e interligação de rede DN 200 mm - reservatório Santa Tereza	Concluído	100%	- 2024-02-28	R\$ 4.636
GPI0380	Implantação de rede de distribuição de água DN 32mm na rua Alto do Venâncio, Cór	Concluído	100%	- 2025-08-31	R\$ 4.614
GPI0548	Remanejamento de rede de distribuição de água DN 100 mm - Rua Córrego da Areia,	Concluído	100%	- 2024-08-31	R\$ 4.349
GPI0585	Remanejamento de rede de distribuição de água DN 63 na rua Córrego do Leôncio, N	Concluído	100%	- 2024-03-31	R\$ 4.238
GPI0389	Implantação de rede de distribuição de água DN 32mm na 2 Travessa Ijuí, Torrões	Concluído	100%	- 2025-08-31	R\$ 4.123
GPI0384	Implantação de rede DN 50mm na rua da Vitória - Passarinho	Concluído	100%	- 2025-08-31	R\$ 4.018
GPI0558	Remanejamento de rede de distribuição de água DN 63mm, na Rua Alto do Bom Jesus,	Concluído	100%	- 2024-07-31	R\$ 3.942
GPI0416	Substituição de rede de distribuição DN 32mm da 2ª travessa Bela Vista	Concluído	100%	- 2025-06-30	R\$ 3.491
GPI0401	Remanejamento de rede de distribuição de água na rua Euxinita, Nova Descoberta	Concluído	100%	- 2025-07-31	R\$ 3.451
GPI0486	Implantação de ramal de água para o Hospital Correia Picanço	Concluído	100%	- 2024-12-30	R\$ 3.131
GPI0415	Substituição de registro de manobra na rua Vasco da Gama	Concluído	100%	- 2025-06-30	R\$ 3.112
GPI0414	Substituição de rede para regularização de abastecimento	Concluído	100%	- 2025-06-30	R\$ 2.688
GPI0479	Substituição de rede de distribuição DN 75 rua Diogenes Sampaio	Concluído	100%	- 2025-01-31	R\$ 2.563
GPI0480	Substituição de rede de distribuição DN 32 subida do Joaquim	Concluído	100%	- 2025-01-31	R\$ 2.513
GPI0502	Remanejamento de rede de distribuição de água DN 75mm na Estrada do Morro da Con	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 2.494
GPI0385	Substituição de registro no reservatório de Santa Tereza	Concluído	100%	- 2025-08-31	R\$ 1.578
GPI0538	Substituição de rede de distribuição de água DN 63mm a Rua Alto do Maracanã	Concluído	100%	- 2024-09-30	R\$ 1.540
GPI0381	Remanejamento de rede de distribuição DN 32mm na rua Assunção, Vasco da Gama	Concluído	100%	- 2025-08-31	R\$ 1.359

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
