


Extrato Municipal - Santa Filomena

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Santa Filomena

Mapa do município

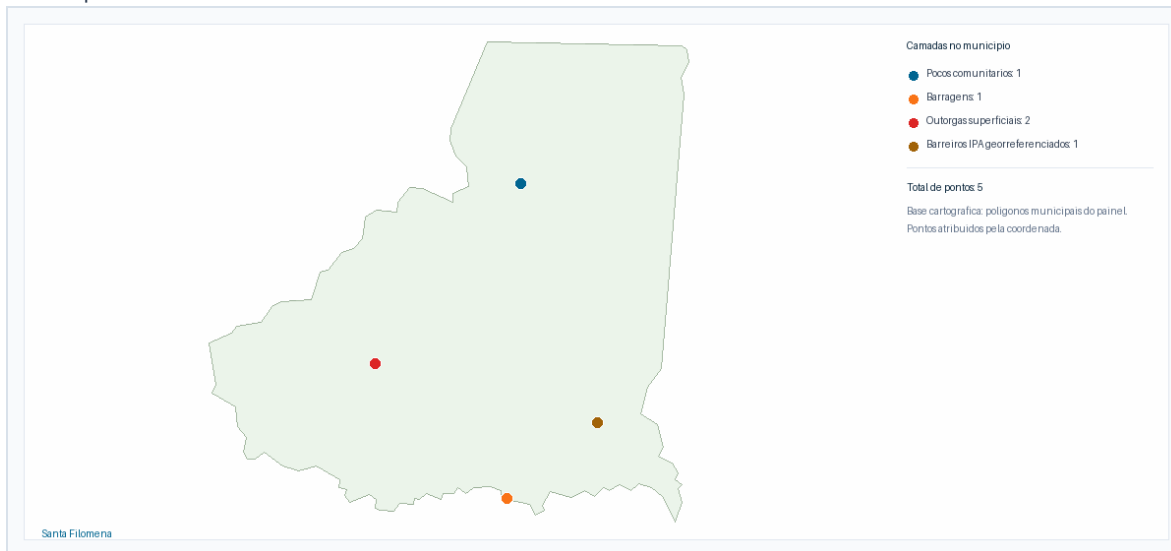

População aglomerada	79	1 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	1	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	1
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	1
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	2
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	6 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 16,5 mi atribuídos ao município
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Pocos comunitários; 1 Barragens; 2 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	6
Concluídas	0
Em execução	3
Planejadas	3
Investimento municipal	R\$ 16,5 mi
Investimento ativo	R\$ 16,5 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restrição explícita

Próxima etapa: Publicar edital de licitação - Programa ETAs de Ultrafiltração - Reforço do Ramal III da partir da barragem Algodões.
Data: 2026-07-30; execução: 0%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Próxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0060	Sistema Adutor de Negreiros para reforço da Adutora do Oeste	Em andamento	5%	Concluir obra 2027-12-01	R\$ 7,4 mi
GPI0277	Ampliação do Sistema Adutor do Oeste	A fazer	0%	Emitir Ordem de Serviço (Obra) 2027-04-02	R\$ 6,1 mi
GPI0067	Programa ETAs de Ultrafiltração - Reforço do Ramal III da partir da barragem Alg	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-07-30	R\$ 2,1 mi
GPI0072	Ampliação da ETA Voluntários da Pátria – Ouricuri - Obras Complementares	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-08-27	R\$ 899.262
GPI0225	Requalificação da estação elevatória de captação de água do sistema adutor do Oe	Em andamento	0%	Concluir obra 2026-08-18	R\$ 3.826
GPI0224	Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste	Em andamento	0%	Concluir obra 2026-08-18	R\$ 2.716

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.
