


Extrato Municipal - Sertânia

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Sertânia

Mapa do município

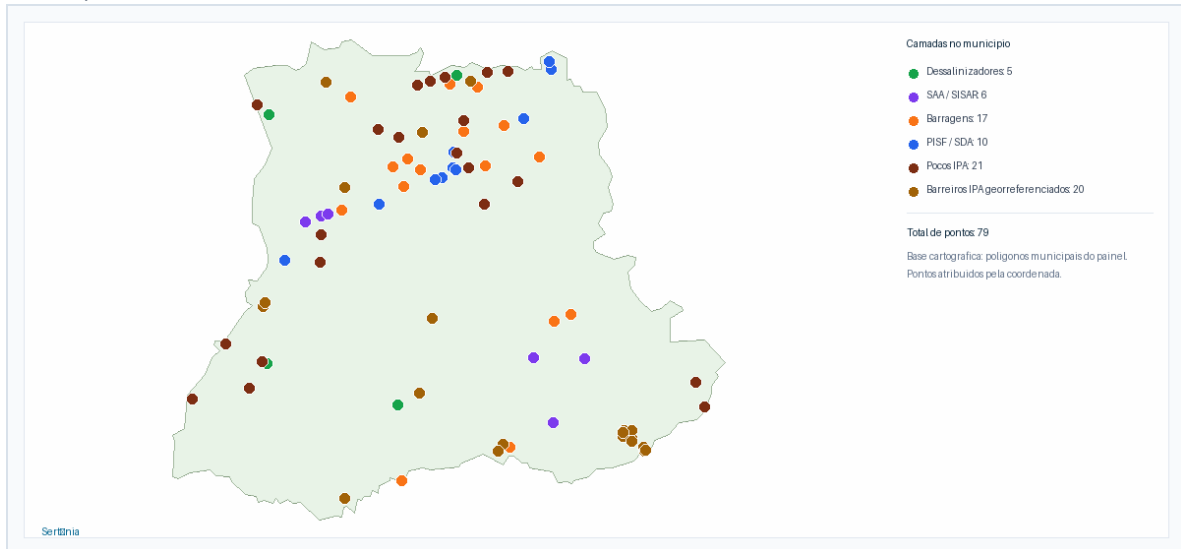

População aglomerada	2.953	14 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	19	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	5
SAA / SISAR	6
Barragens	17
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	10
Pocos IPA	19
Barreiros IPA georreferenciados	20

Instituição	Resumo
Compesa	8 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 36,3 mi atribuídos ao município
SDA	0 PAD; 10 PISF; 7 aguadas; 0 cisternas
IPA	19 pocos; 4 instalados; 10 barreiros; 0 BPP
SRHS	5 Dessalinizadores; 6 SAA / SISAR; 17 Barragens

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	8
Concluídas	7
Em execucao	1
Planejadas	0
Investimento municipal	R\$ 36,3 mi
Investimento ativo	R\$ 15,5 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Programa de ETAs de Ultrafiltração - Sistema adutor de Sertânia a partir da Barragem de Campos.
Data: 2026-12-31; execucao: 32%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0129	Programa de ETAs de Ultrafiltração - Sistema adutor de Sertânia a partir da Barr	Em andamento	32%	Concluir obra 2026-12-31	R\$ 15,5 mi
GPI0604	Implantação da Adutora de Moxotó para Custódia	Concluído	100%	- 2023-10-09	R\$ 8,9 mi
GPI0371	Ampliação e adequação do SAA do Distrito Sede do Município de Sertânia	Concluído	100%	- 2025-10-30	R\$ 8,4 mi
GPI0397	Implantação - SAA Albuquerque Né (Sertânia)	Concluído	100%	- 2025-08-01	R\$ 1,9 mi
GPI0610	Conclusão do SAA Rio da Barra - Sertânia (PISF)	Concluído	100%	- 2023-08-30	R\$ 1,1 mi
GPI0574	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água das Comunidades Rurais de Recant	Concluído	100%	- 2024-05-28	R\$ 335.004
GPI0580	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade Rural de Riacho Se	Concluído	100%	- 2024-04-29	R\$ 137.561
GPI0535	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade Rural de Sete Volt	Concluído	100%	- 2024-10-01	R\$ 132.952

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
