


Extrato Municipal - Vertente Do Lério

Gerado em 29/07/2026 06:08. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Vertente Do Lério

Mapa do município

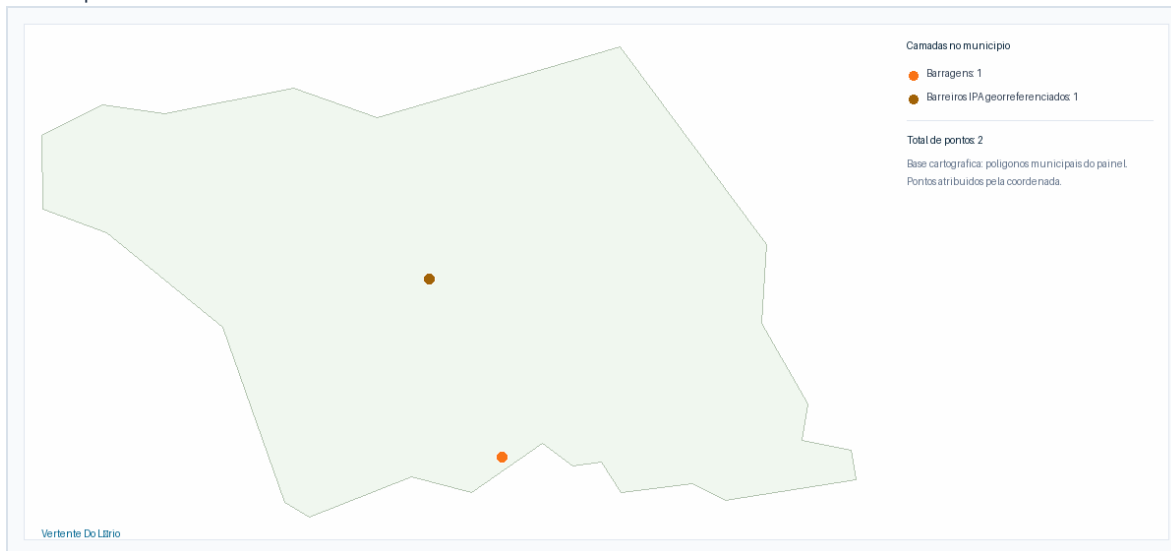

População aglomerada	2.305	10 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 10. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	1
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	6 obras; R\$ 34,1 mi; fase predominante: Concluídas
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Barragens

Todas as obras Compesa

Obra	Status	Valor	Exec.
Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste Lote 4B ETA Salgado (Caruaru) a Santa Cruz do Cap	Em andamento	R\$ 147,5 mi	72%
Requalificação do Sistema Produtor Jucazinho	A licitar	R\$ 84,1 mi	0%
Programa ETAs de Ultrafiltração - Aquisição de 2 ETAs Jucazinho - 100 L/s	A iniciar	R\$ 31,4 mi	0%
Interligação Adutora do Agreste a Jucazinho (Trecho Urbano de Caruaru)	Concluído	R\$ 5,5 mi	100%
ETA Dupla Filtração de 200 L/s Bela Vista - Caruaru	Concluído	R\$ 4,6 mi	100%
Adutora do Alto Capibaribe - 2ª Etapa	Concluído	R\$ 1,7 mi	99%
