


Extrato Municipal - Abreu E Lima

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Abreu E Lima

Mapa do município

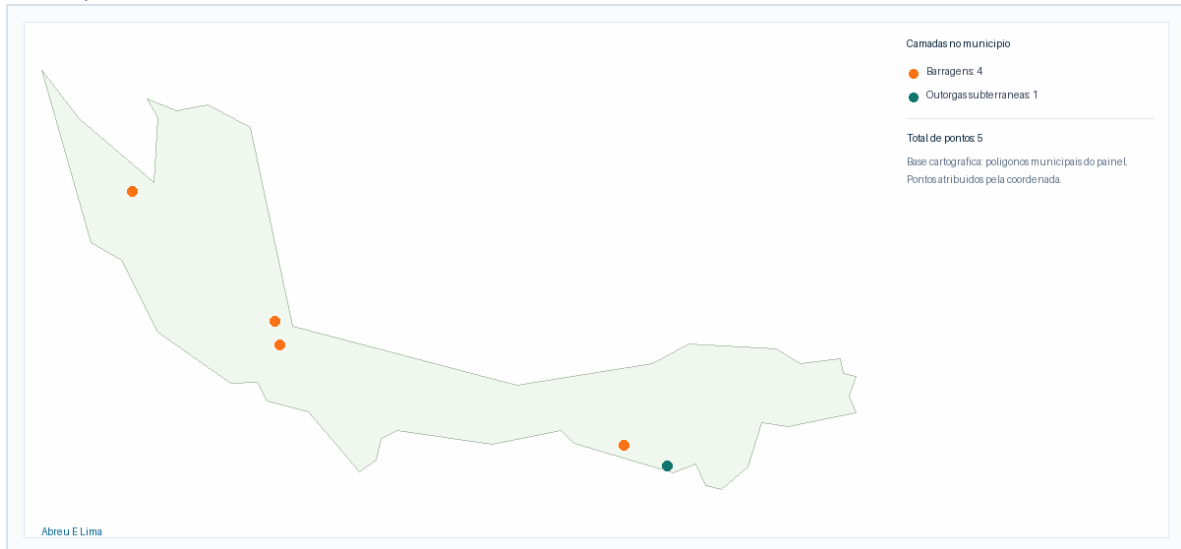

População aglomerada	208	1 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	1	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	4
Outorgas subterrâneas	1
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	0

Instituição	Resumo
Compesa	12 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 120,0 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	4 Barragens; 1 Outorgas subterrâneas

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	12
Concluídas	4
Em execucao	0
Planejadas	8
Investimento municipal	R\$ 120,0 mi
Investimento ativo	R\$ 106,3 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Emitir ordem de serviço - SES Caetés - Recuperação do SES Existente (ETE 05.01 - ETEJ-03). Data: 2026-08-25; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	27.2%
Areas publicadas	37
Abastecimento continuo	5
Areas em rodizio	32
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Rodizio: 22 h com agua / 7 dias sem agua | Intermitente diario: 4 h com agua / 9 h sem agua | Rodizio: 1 dia com agua / 1 dia sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0293	SES Caetés - Recuperação do SES Existente (ETE 05.01 - ETEJ-03)	A iniciar	0%	Emitir ordem de serviço 2026-08-25	R\$ 44,0 mi
GPI0071	SES da Nova Escola de Sargentos do Exército	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-31	R\$ 34,1 mi
GPI0263	Poços RMR - Implantação de 25 Poços na RMR	A elaborar projeto	0%	Publicação de edital 2026-08-30	R\$ 15,8 mi
GPI0035	Implantação do Sistema Adutor Arataca II	Concluído	100%	- 2026-01-31	R\$ 11,8 mi
GPI0262	SAA Botafogo - Requalificação do Sistema Produtor Botafogo	A elaborar projeto	0%	Publicar edital 2026-08-30	R\$ 9,0 mi
GPI0150	SAA Botafogo - Aquisição e Instalação de ETA 200 L/s em Fibra de Vidro de Parati	A iniciar	0%	Emitir ordem de serviço 2026-08-28	R\$ 1,4 mi

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0149	SAA Botafogo - Sistema Adutor do Rio Paratibe até o SP Navarro	A iniciar	0%	Emitir ordem de serviço 2026-08-28	R\$ 1,2 mi
GPI0151	SAA Botafogo - Recuperação da ETA Botafogo	Concluído	100%	- 2026-01-30	R\$ 950.826
GPI0153	SAA Botafogo - Sistema de Bombeamento da EEAB Botafogo I (Catucá)	Concluído	100%	- 2025-03-24	R\$ 887.918
GPI0152	SAA Botafogo - Reabilitação Eletromecânica da ETA Botafogo	Em licitação	0%	Emitir ordem de serviço 2026-08-31	R\$ 696.794
GPI0036	Implantação do Sistema Adutor Arataca II (Complemento)	A licitar	0%	Publicar edital 2026-08-31	R\$ 78.926
GPI0679	Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água	Concluído	100%	- 2026-06-30	R\$ 60.219

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
