


Extrato Municipal - Belo Jardim

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Belo Jardim

Mapa do município

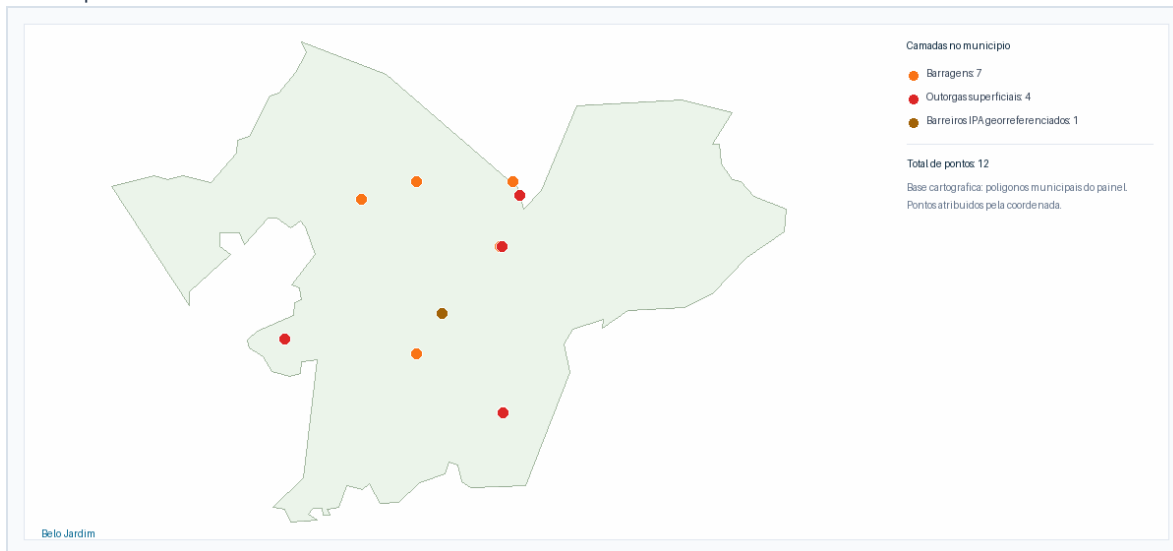

População aglomerada	5.310	23 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 23. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	7
Outorgas subterraneas	0
Outorgas superficiais	3
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituicao	Resumo
Compesa	11 iniciativas; 9 projetos KML; R\$ 89,9 mi atribuídos; abastecimento: Rodizio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	7 Barragens; 3 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	11
Concluídas	6
Em execucao	2
Planejadas	3
Investimento municipal	R\$ 89,9 mi
Investimento ativo	R\$ 74,7 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Implantação do SES Belo Jardim - Complementação. Data: 2026-09-03; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Abastecimento continuo
Cobertura programada ponderada	89.4%
Areas publicadas	82
Abastecimento continuo	52
Areas em rodizio	15
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	15

Padroes observados: Rodizio: 5 dias com agua / 5 dias sem agua | Rodizio: 3 dias com agua / 4 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0075	Implantação do SES Belo Jardim - Complementação	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-09-03	R\$ 47,9 mi
GPI0114	Programa ETAs de Ultrafiltração - Instalação de ETA de ultrafiltração e melhoria	Em andamento	61%	Concluir obra 2026-11-30	R\$ 19,9 mi
GPI0001	Estação Elevatória de Água Bruta da 1ª etapa da Adutora do Sistema Adutor do Agr	Concluído	100%	- 2024-02-29	R\$ 13,9 mi
GPI0249	Implantação de rede de distribuição para o Sítio Muquem e Adjacências, em Belo J	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-09-30	R\$ 3,0 mi
GPI0286	Recuperação da barragem Serro Azul + implantação do plano de emergência	A licitar	0%	- 2028-04-28	R\$ 2,4 mi
GPI0202	Melhoria e Adequação da ETA Manoel Longo e ETA Bitury	Em andamento	30%	Concluir obra 2027-03-19	R\$ 1,6 mi

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0599	Laboratório Belo Jardim	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 559.818
GPI0359	Implantação da Captação Emergencial Barragem de Góis - PISF	Concluído	100%	- 2025-12-12	R\$ 533.580
GPI0544	Substituição de redes de distribuição nas Ruas: Garanhuns e Pedro Fabrício	Concluído	100%	- 2024-09-20	R\$ 78.650
GPI0598	Abastecimento de Serra dos Ventos através da adutora do Agreste e Reforma da Est	Concluído	100%	- 2024-02-29	R\$ 30.000
GPI0627	Execução de Canal de Água Floculada ETA Bitury	Concluído	100%	- 2023-05-16	R\$ 17.246

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
