


Extrato Municipal - Igarassu

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Igarassu

Mapa do município

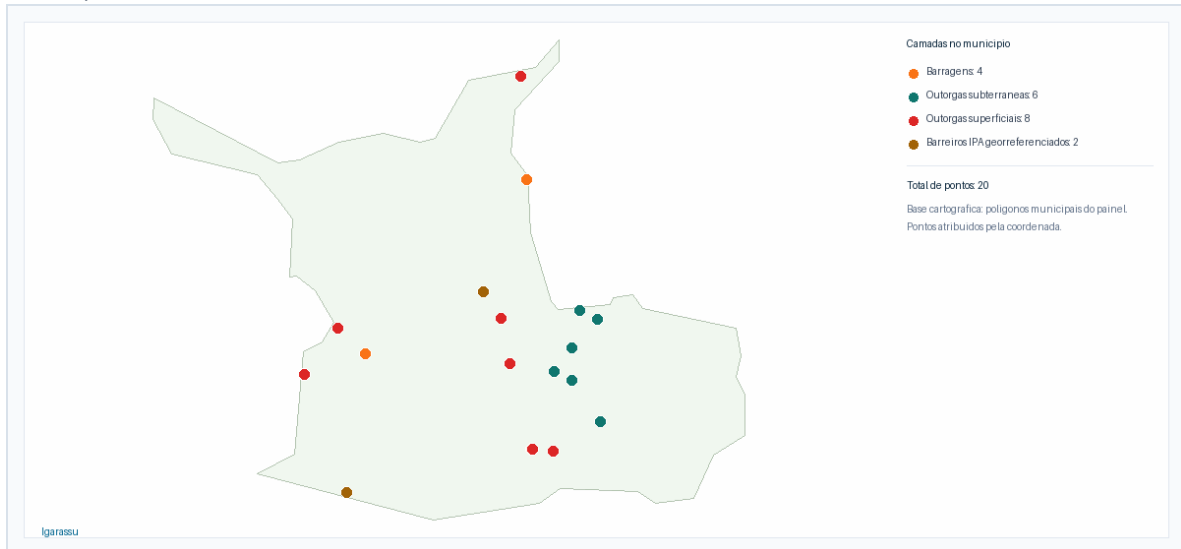

População aglomerada	782	2 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	6	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	4
Outorgas subterrâneas	6
Outorgas superficiais	8
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	2

Instituição	Resumo
Compesa	10 iniciativas; 3 projetos KML; R\$ 35,0 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	4 Barragens; 6 Outorgas subterrâneas; 8 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	10
Concluídas	4
Em execucao	1
Planejadas	5
Investimento municipal	R\$ 35,0 mi
Investimento ativo	R\$ 20,6 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Emitir ordem de serviço - SAA Botafogo - Sistema Adutor do Rio Paratibe até o SP Navarro. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	50.9%
Areas publicadas	44
Abastecimento continuo	22
Areas em rodizio	22
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	0

Padroes observados: Intermitente diario: 9 h com agua / 15 h sem agua | Rodizio: 10 h com agua / 1.6 dias sem agua | Rodizio: 9 h com agua / 1.6 dias sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0035	Implantação do Sistema Adutor Arataca II	Concluído	100%	- 2026-01-31	R\$ 12,1 mi
GPI0262	SAA Botafogo - Requalificação do Sistema Produtor Botafogo	A elaborar projeto	0%	Publicar edital 2026-08-30	R\$ 9,2 mi
GPI0170	Poços RMR - 5 - Reforço do SAA Igarassu a partir da bateria de poços de Cruz de	Em andamento	54%	Concluir obra 2026-09-30	R\$ 7,9 mi
GPI0150	SAA Botafogo - Aquisição e Instalação de ETA 200 L/s em Fibra de Vidro de Parati	A iniciar	0%	Emitir ordem de serviço 2026-08-28	R\$ 1,4 mi
GPI0149	SAA Botafogo - Sistema Adutor do Rio Paratibe até o SP Navarro	A iniciar	0%	Emitir ordem de serviço 2026-08-28	R\$ 1,2 mi
GPI0151	SAA Botafogo - Recuperação da ETA Botafogo	Concluído	100%	- 2026-01-30	R\$ 969.882

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0153	SAA Botafogo - Sistema de Bombeamento da EEAB Botafogo I (Catucá)	Concluído	100%	- 2025-03-24	R\$ 905.713
GPI0152	SAA Botafogo - Reabilitação Eletromecânica da ETA Botafogo	Em licitação	0%	Emitir ordem de serviço 2026-08-31	R\$ 710.759
GPI0683	Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água	Concluído	100%	- 2026-06-30	R\$ 410.799
GPI0036	Implantação do Sistema Adutor Arataca II (Complemento)	A licitar	0%	Publicar edital 2026-08-31	R\$ 80.508

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
