


Extrato Municipal - Jataúba

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Jataúba

Mapa do município

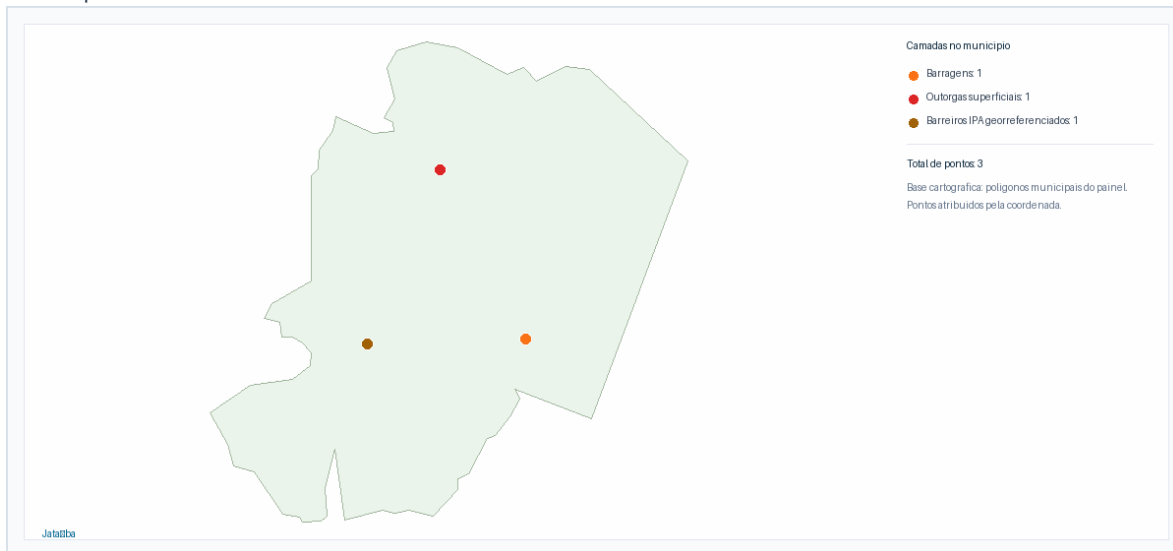

População aglomerada	610	3 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	1
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	6 iniciativas; 6 projetos KML; R\$ 39,3 mi atribuídos; abastecimento: Sem calendário publicado
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Barragens; 1 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	6
Concluídas	2
Em execucao	1
Planejadas	3
Investimento municipal	R\$ 39,3 mi
Investimento ativo	R\$ 36,3 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Prazo de conclusao - Estação de Tratamento de Água de 200 L/s para Santa Cruz do Capibaribe. Data: 2026-08-30; execucao: 100%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Sem calendario publicado
Situacao predominante	Sem calendario publicado
Cobertura programada ponderada	0.0%
Areas publicadas	21
Abastecimento continuo	0
Areas em rodizio	0
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	21

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0704	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 1 - Trecho Brejo da Madre de Deus e Jataúb	A licitar	0%	Relicitar projeto 2026-08-30	R\$ 30,0 mi
GPI0710	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 3,3 mi
GPI0494	Adutora do Alto Capibaribe - 1º etapa	Concluído	100%	- 2024-12-20	R\$ 2,7 mi
GPI0709	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 2,5 mi
GPI0183	Estação de Tratamento de Água de 200 L/s para Santa Cruz do Capibaribe	Em andamento	100%	- 2026-08-30	R\$ 517.308
GPI0411	Ampliação e readequação do SAA de Jataúba	Concluído	100%	- 2025-06-30	R\$ 341.211

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
