


Extrato Municipal - Salgueiro

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Salgueiro

Mapa do município

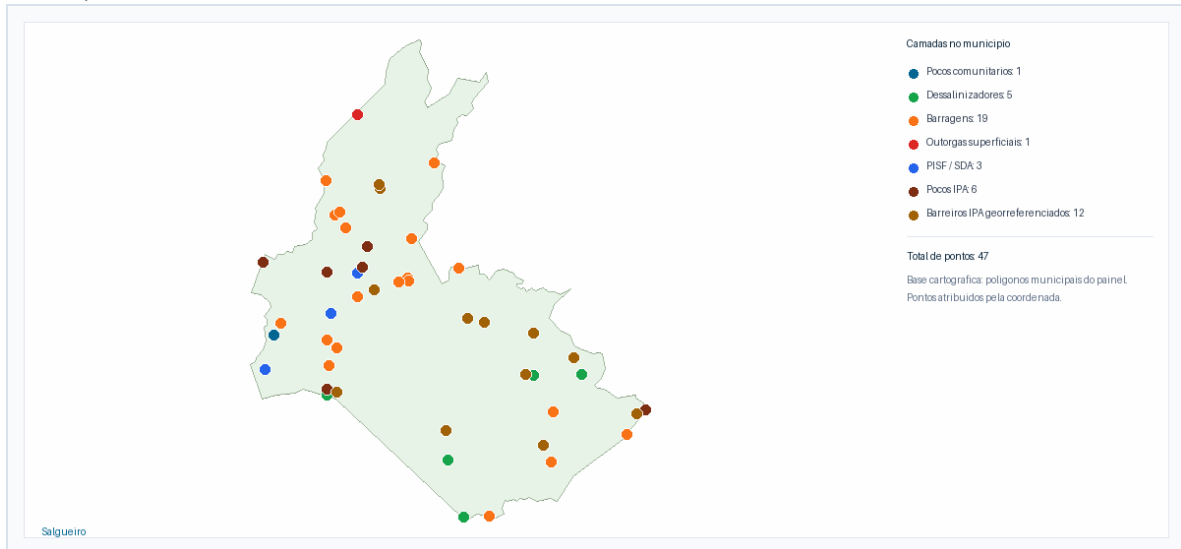

Populacao aglomerada	4.188	36 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	8	Lacuna estimada: 28. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	1
Dessalinizadores	5
SAA / SISAR	0
Barragens	18
Outorgas subterraneas	0
Outorgas superficiais	1
PAD / SDA	0
PISF / SDA	3
Pocos IPA	6
Barreiros IPA georreferenciados	12

Instituicao	Resumo
Compesa	4 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 45,5 mi atribuidos; abastecimento: Rodizio
SDA	0 PAD; 3 PISF; 25 aguadas; 203 cisternas
IPA	11 pocos; 1 instalados; 10 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Pocos comunitarios; 5 Dessalinizadores; 18 Barragens; 1 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	4
Concluídas	2
Em execucao	2
Planejadas	0
Investimento municipal	R\$ 45,5 mi
Investimento ativo	R\$ 44,9 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Programa ETAs de Ultrafiltração - Novo Sistema Adutor para Verdejante a partir da ETA Salgueiro.
Data: 2026-11-30; execucao: 42%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Rodizio
Cobertura programada ponderada	57.9%
Areas publicadas	65
Abastecimento continuo	12
Areas em rodizio	52
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	1

Padroes observados: Rodizio: 3 dias com agua / 4 dias sem agua | Rodizio: 4 dias com agua / 3 dias sem agua | Intermitente diario: 10 h com agua / 14 h sem agua

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0184	Programa ETAs de Ultrafiltração - Novo Sistema Adutor para Verdejante a partir d	Em andamento	42%	Concluir obra 2026-11-30	R\$ 34,5 mi
GPI0243	Implantação do SAA Umãs e Guarani a Partir do Reservatório de Livramento	Em andamento	5%	Concluir obra 2028-01-18	R\$ 10,4 mi
GPI0379	Melhoria na rede de distribuição de Salgueiro	Concluído	100%	- 2025-09-09	R\$ 293.872
GPI0216	Implantação de 500m de Adutora no Sistema Adutor do Sertão, em Cabrobó (Boqueir	Concluído	100%	- 2026-06-30	R\$ 253.679

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
