


Extrato Municipal - São Bento Do Una

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

São Bento Do Una

Mapa do município

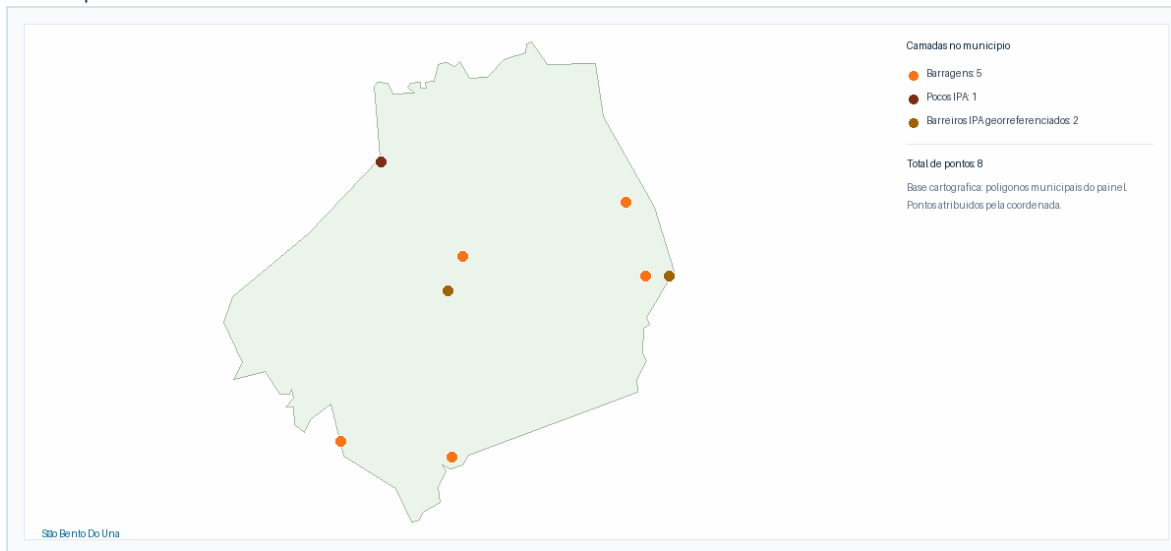

População aglomerada	4.029	30 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 30. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	5
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	2

Instituição	Resumo
Compesa	8 iniciativas; 5 projetos KML; R\$ 84,9 mi atribuídos; abastecimento: Rodízio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	5 Barragens

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	8
Concluídas	5
Em execucao	2
Planejadas	1
Investimento municipal	R\$ 84,9 mi
Investimento ativo	R\$ 63,0 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 5C (Brejo da Madre de Deus - São Bento do Una). Data: 2026-09-30; execucao: 92%.

Calendario de abastecimento Compesa

Indicador	Valor
Mes de referencia	2026-08
Situacao mais critica	Rodizio
Situacao predominante	Sem calendario publicado
Cobertura programada ponderada	30.4%
Areas publicadas	37
Abastecimento continuo	3
Areas em rodizio	5
Areas em colapso	0
Mes sem abastecimento	0
Sem calendario publicado	29

Padroes observados: Abastecimento parcial: 13 h no mes | Abastecimento parcial: 3 dias no mes | Abastecimento parcial: 6 dias no mes

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0004	Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste - Lote 5C (Brejo da Madre de Deus	Em andamento	92%	Concluir obra 2026-09-30	R\$ 61,5 mi
GPI0126	Programa ETAs de Ultrafiltração - Implantação de ETA de Ultrafiltração e ETEF em	Concluído	100%	- 2026-06-30	R\$ 17,1 mi
GPI0485	Usina Fotovoltaica para Beneficiar Unidades Consumidoras Compesa – São Bento do	Concluído	100%	- 2024-12-30	R\$ 4,4 mi
GPI0286	Recuperação da barragem Serro Azul + implantação do plano de emergência	A licitar	0%	- 2028-04-28	R\$ 879.358
GPI0202	Melhoria e Adequação da ETA Manoel Longo e ETA Bitury	Em andamento	30%	Concluir obra 2027-03-19	R\$ 583.792

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0599	Laboratório Belo Jardim	Concluído	100%	- 2024-11-30	R\$ 205.719
GPI0359	Implantação da Captação Emergencial Barragem de Góis - PISF	Concluído	100%	- 2025-12-12	R\$ 196.077
GPI0627	Execução de Canal de Água Floculada ETA Bitury	Concluído	100%	- 2023-05-16	R\$ 6.337

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
