


## Extrato Municipal - Toritama

Gerado em 03/08/2026 14:36. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

### Toritama

Mapa do município

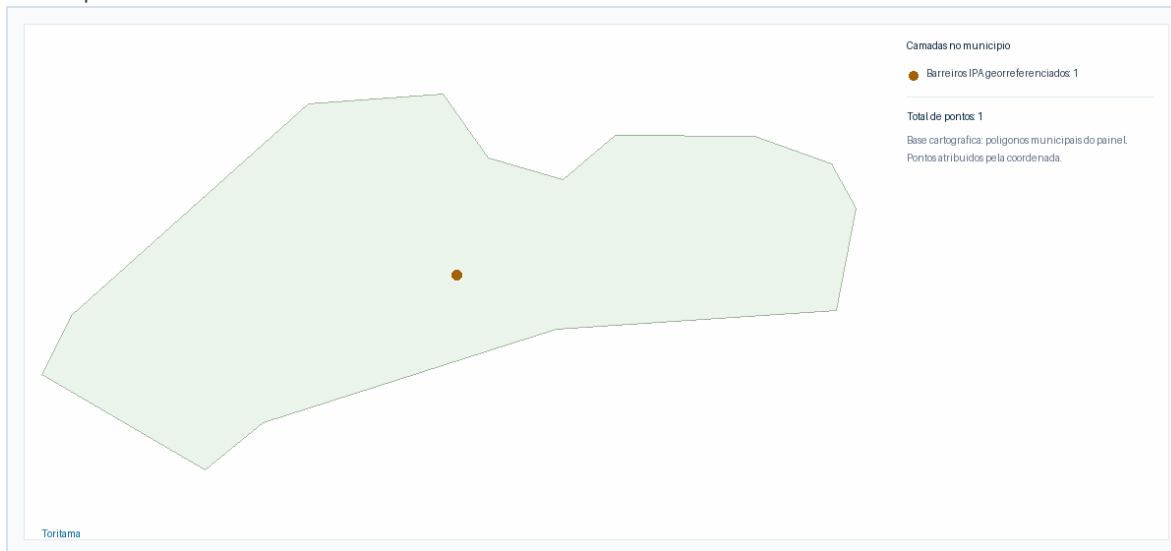

|                       |     |                                                                                                             |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| População aglomerada  | 622 | 3 aglomerados rurais.                                                                                       |
| Infraestrutura direta | 0   | Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada. |
| Decreto de estiagem   | Não | Recorte informado na base de estiagem.                                                                      |

| Base                            | Quantidade |
|---------------------------------|------------|
| Pocos comunitários              | 0          |
| Dessalinizadores                | 0          |
| SAA / SISAR                     | 0          |
| Barragens                       | 1          |
| Outorgas subterrâneas           | 0          |
| Outorgas superficiais           | 0          |
| PAD / SDA                       | 0          |
| PISF / SDA                      | 0          |
| Pocos IPA                       | 0          |
| Barreiros IPA georreferenciados | 1          |

| Instituição | Resumo                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compesa     | 11 iniciativas; 8 projetos KML; R\$ 92,3 mi atribuídos; abastecimento: Sem calendário publicado |
| SDA         | 0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 60 cisternas                                                          |
| IPA         | 0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP                                                       |
| SRHS        | 1 Barragens                                                                                     |

#### Carteira Compesa municipal

| Indicador              | Valor                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Iniciativas            | 11                                      |
| Concluídas             | 3                                       |
| Em execucao            | 3                                       |
| Planejadas             | 5                                       |
| Investimento municipal | R\$ 92,3 mi                             |
| Investimento ativo     | R\$ 70,2 mi                             |
| Atendimento na base    | Com carteira ou sem restricao explicita |

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Melhoria e Ampliação do SAA Toritama. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

#### Calendario de abastecimento Compesa

| Indicador                      | Valor                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Mes de referencia              | 2026-08                  |
| Situacao mais critica          | Sem calendario publicado |
| Situacao predominante          | Sem calendario publicado |
| Cobertura programada ponderada | 0.0%                     |
| Areas publicadas               | 8                        |
| Abastecimento continuo         | 0                        |
| Areas em rodizio               | 0                        |
| Areas em colapso               | 0                        |
| Mes sem abastecimento          | 0                        |
| Sem calendario publicado       | 8                        |

O padrao de rodizio e estimado a partir dos intervalos publicados pela Compesa; colapso e mes sem abastecimento sao marcacoes explicitas da fonte.

#### Todas as iniciativas Compesa

| ID      | Iniciativa                                                                       | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo                     | Valor municipal |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| GPI0002 | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste Lote 4B ETA Salgado (Caruaru) a Sa | Em andamento | 79%   | Concluir obra   2026-12-30                | R\$ 42,0 mi     |
| GPI0028 | Adutora do Alto Capibaribe - 2ª Etapa                                            | Concluído    | 100%  | -   2026-06-26                            | R\$ 21,4 mi     |
| GPI0111 | Programa ETAs de Ultrafiltração - Aquisição de 2 ETAs Jucazinho - 100 L/s        | A iniciar    | 0%    | Recebimento da ETA   2027-04-30           | R\$ 9,4 mi      |
| GPI0264 | Requalificação do Sistema Produtor Jucazinho                                     | A licitar    | 0%    | Publicar edital   2026-09-30              | R\$ 4,7 mi      |
| GPI0183 | Estação de Tratamento de Água de 200 L/s para Santa Cruz do Capibaribe           | Em andamento | 100%  | -   2026-08-30                            | R\$ 4,1 mi      |
| GPI0247 | Melhoria e Ampliação do SAA Toritama                                             | A licitar    | 0%    | Publicar edital de licitação   2026-08-28 | R\$ 4,0 mi      |
| GPI0266 | Requalificação dos Sistemas Produtores do Interior ( Agreste e Matas )           | A licitar    | 0%    | Publicar edital   2026-09-30              | R\$ 3,4 mi      |

| ID      | Iniciativa                                                              | Status       | Exec. | Proxima etapa / prazo      | Valor municipal |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
| GPI0137 | Adequação e Ampliação da ETA Toritama                                   | Em andamento | 0%    | Concluir obra   2026-12-23 | R\$ 1,6 mi      |
| GPI0286 | Recuperação da barragem Serro Azul + implantação do plano de emergência | A licitar    | 0%    | -   2028-04-28             | R\$ 1,0 mi      |
| GPI0444 | Interligação Adutora do Agreste a Jucazinho (Trecho Urbano de Caruaru)  | Concluído    | 100%  | -   2025-04-06             | R\$ 352.146     |
| GPI0180 | ETA Dupla Filtração de 200 L/s Bela Vista - Caruaru                     | Concluído    | 100%  | -   2025-08-31             | R\$ 333.997     |

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
