


Extrato Municipal - Afogados Da Ingazeira

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Afogados Da Ingazeira

Mapa do município

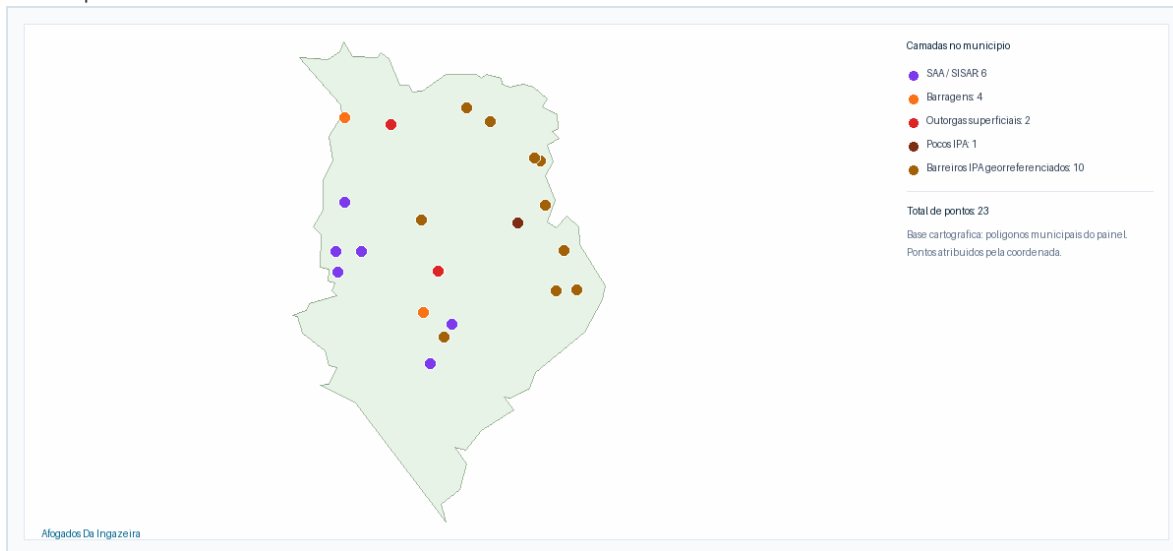

População aglomerada	991	5 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	6	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	6
Barragens	4
Outorgas subterraneas	0
Outorgas superficiais	2
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	3
Barreiros IPA georreferenciados	10

Instituicao	Resumo
Compesa	8 iniciativas; 0 projetos KML; R\$ 36,5 mi atribuídos ao município
SDA	0 PAD; 0 PISF; 17 aguadas; 0 cisternas
IPA	3 pocos; 0 instalados; 10 barreiros; 0 BPP
SRHS	6 SAA / SISAR; 4 Barragens; 2 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	8
Concluídas	4
Em execucao	2
Planejadas	2
Investimento municipal	R\$ 36,5 mi
Investimento ativo	R\$ 34,4 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Emitir Ordem de Serviço - Requalificação da ETA Afogados da Ingazeira. Data: 2026-08-15; execucao: 0%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0269	Duplicação da adutora do Pajeú	A licitar	0%	Publicar edital do projeto 2026-08-21	R\$ 18,6 mi
GPI0218	Requalificação da ETA Afogados da Ingazeira	A iniciar	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-08-15	R\$ 7,5 mi
GPI0131	Programa de ETAs de Ultrafiltração - Ampliação da ETA Tabira	Em andamento	6%	Concluir obra 2026-12-31	R\$ 7,1 mi
GPI0199	Implantação da ETA Itã e interligação ao Sistema Adutor do Pajeú em Carnaíba	Em andamento	12%	Concluir obra 2026-12-02	R\$ 1,2 mi
GPI0514	Recuperação da Barragem de Brotas	Concluído	100%	- 2024-11-14	R\$ 1,1 mi
GPI0611	Sistema de Abastecimento do Povoado Poço de Pedra e Carnaibinha	Concluído	100%	- 2023-08-24	R\$ 412.921
GPI0431	Extensão captação Flutuante da Barragem de Campos - PISF	Concluído	100%	- 2025-05-16	R\$ 370.795
GPI0618	Sistema de Abastecimento do Povoado Curral Velho dos Ramos	Concluído	100%	- 2023-07-26	R\$ 260.096

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
