


Extrato Municipal - Araripina

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Araripina

Mapa do município

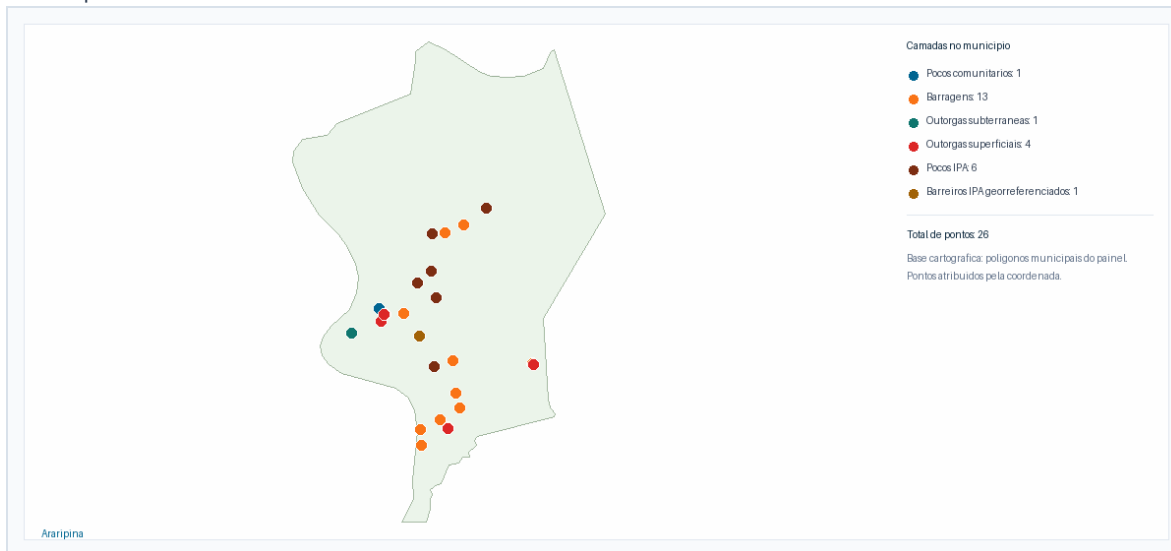

Populacao aglomerada	2.059	10 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	4	Lacuna estimada: 6. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda nao instalada.
Decreto de estiagem	Sim	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	1
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	13
Outorgas subterraneas	1
Outorgas superficiais	4
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	6
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituicao	Resumo
Compesa	8 iniciativas; 2 projetos KML; R\$ 262,4 mi atribuidos ao municipio
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	6 pocos; 2 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Pocos comunitarios; 13 Barragens; 1 Outorgas subterraneas; 4 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	8
Concluídas	0
Em execucao	4
Planejadas	4
Investimento municipal	R\$ 262,4 mi
Investimento ativo	R\$ 262,4 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Concluir obra - Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste em Jacaré - Parnamirim. Data: 2026-08-18; execucao: 0%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0060	Sistema Adutor de Negreiros para reforço da Adutora do Oeste	Em andamento	5%	Concluir obra 2027-12-01	R\$ 85,8 mi
GPI0277	Ampliação do Sistema Adutor do Oeste	A fazer	0%	Emitir Ordem de Serviço (Obra) 2027-04-02	R\$ 71,1 mi
GPI0282	Poços do Sertão	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-10-01	R\$ 55,2 mi
GPI0078	Programa ETAs de Ultrafiltração - Novo Sistema Produtor Lagoa do Barro - Araripi	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-30	R\$ 37,8 mi
GPI0072	Ampliação da ETA Voluntários da Pátria – Ouricuri - Obras Complementares	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-08-27	R\$ 10,4 mi
GPI0194	Substituição de Trecho do Sistema Adutor do Oeste em Trindade	Em andamento	49%	Concluir obra 2026-11-30	R\$ 1,9 mi
GPI0225	Requalificação da estação elevatória de captação de água do sistema adutor do Oe	Em andamento	0%	Concluir obra 2026-08-18	R\$ 44.370
GPI0224	Requalificação da Estação Elevatória de Água Bruta II do Sistema Adutor do Oeste	Em andamento	0%	Concluir obra 2026-08-18	R\$ 31.496

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
