


Extrato Municipal - Camaragibe

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Camaragibe

Mapa do município

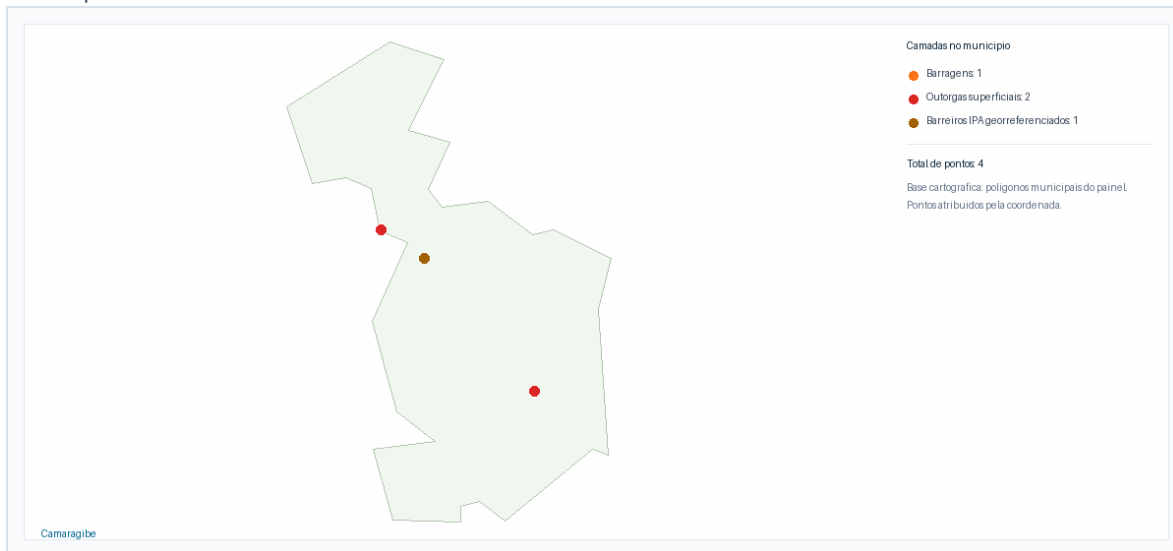

População aglomerada	0	0 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 0. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	3
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	3
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	19 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 116,0 mi atribuídos ao município
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	3 Barragens; 3 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	19
Concluídas	14
Em execucao	2
Planejadas	3
Investimento municipal	R\$ 116,0 mi
Investimento ativo	R\$ 106,5 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - SAA Tapacurá - Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá. Data: 2026-08-30; execucao: 0%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0080	SAA da Nova Escola de Formação de Sargentos do Exército	A licitar	0%	Emitir ordem de serviço 2026-11-11	R\$ 61,4 mi
GPI0038	Implantação do Novo Sistema Adutor de Camaragibe a partir da EEAT Viana	Em andamento	68%	Concluir obra 2027-01-29	R\$ 30,0 mi
GPI0261	SAA Tapacurá - Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-30	R\$ 10,0 mi
GPI0360	Complementação da Adutora de Tabatinga	Concluído	100%	- 2025-12-11	R\$ 8,3 mi
GPI0284	Recuperação da barragem Pirapama	A licitar	0%	- 2028-12-29	R\$ 4,2 mi
GPI0188	SAA Tapacurá - Retrofit dos filtros da ETA Castelo Branco	Em andamento	62%	Concluir obra 2026-09-21	R\$ 822.231
GPI0681	Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água	Concluído	100%	- 2026-06-30	R\$ 711.354
GPI0358	Assentamento de 3.000m de rede para melhoria no abastecimento e redução de perda	Concluído	100%	- 2025-12-15	R\$ 228.201
GPI0488	Assentamento de 372m de rede para melhoria no abastecimento	Concluído	100%	- 2024-12-30	R\$ 61.158
GPI0392	Substituição de Rede de 500mm com vazamento	Concluído	100%	- 2025-08-31	R\$ 44.736
GPI0406	Assentamento de 90m de rede para melhoria no abastecimento	Concluído	100%	- 2025-07-31	R\$ 26.969
GPI0421	Substituição de 200m de rede aparente e com vazamentos frequentes	Concluído	100%	- 2025-06-30	R\$ 24.204
GPI0481	Substituição de 280m rede aparente e com vazamentos frequentes	Concluído	100%	- 2025-01-31	R\$ 21.144
GPI0405	Substituição de 205m de rede que estavam aparente	Concluído	100%	- 2025-07-31	R\$ 18.771
GPI0526	Assentamento de 150m rede para melhoria no abastecimento	Concluído	100%	- 2024-10-30	R\$ 17.301
GPI0573	Substituição de 270m rede aparente e com vazamentos frequentes	Concluído	100%	- 2024-05-30	R\$ 15.701

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0489	Substituição de 130m rede aparente e com vazamentos frequentes	Concluído	100%	- 2024-12-30	R\$ 14.836
GPI0541	Substituição de 54m rede que estava com vazamento sob as casas	Concluído	100%	- 2024-09-30	R\$ 11.763
GPI0482	Substituição de 90m rede aparente e com vazamentos frequentes	Concluído	100%	- 2025-01-31	R\$ 7.964

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
