


Extrato Municipal - Cupira

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Cupira

Mapa do município

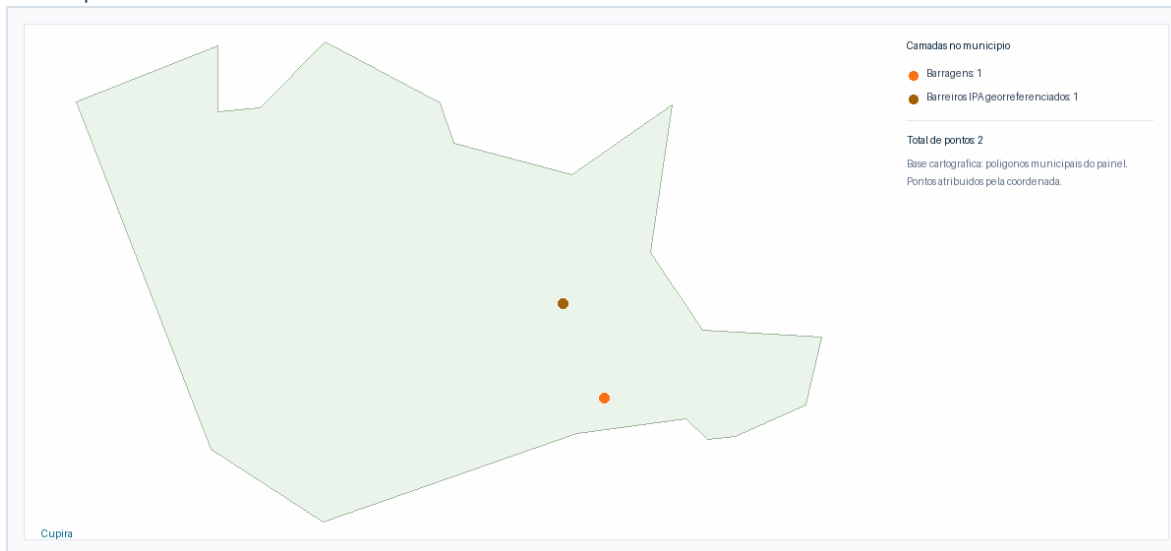

População aglomerada	398	3 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 3. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	1
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	0
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	5 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 71,8 mi atribuídos ao município
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 60 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	1 Barragens

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	5
Concluídas	1
Em execução	1
Planejadas	3
Investimento municipal	R\$ 71,8 mi
Investimento ativo	R\$ 67,5 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restrição explícita

Próxima etapa: Concluir obra - Requalificação da Captação do Sistema Integrado Cajueiro. Data: 2026-12-03; execução: 0%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Próxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0718	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 05	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2027-05-02	R\$ 32,6 mi
GPI0710	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - Duplicação do trecho da ETA até Belo	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 19,2 mi
GPI0709	2ª Etapa da Adutora do Agreste - Lote 2 - 2ª Etapa da ETA, Captação e Adutora d	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-12-30	R\$ 14,3 mi
GPI0349	Recuperação do Sistema de Abastecimento a partir da Barragem de São Jorge	Concluído	100%	- 2026-04-16	R\$ 4,3 mi
GPI0210	Requalificação da Captação do Sistema Integrado Cajueiro	Em andamento	0%	Concluir obra 2026-12-03	R\$ 1,3 mi

População beneficiada e informada por iniciativa e não deve ser somada, pois pode haver sobreposição entre beneficiários.
