


Extrato Municipal - Ipojuca

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Ipojuca

Mapa do município

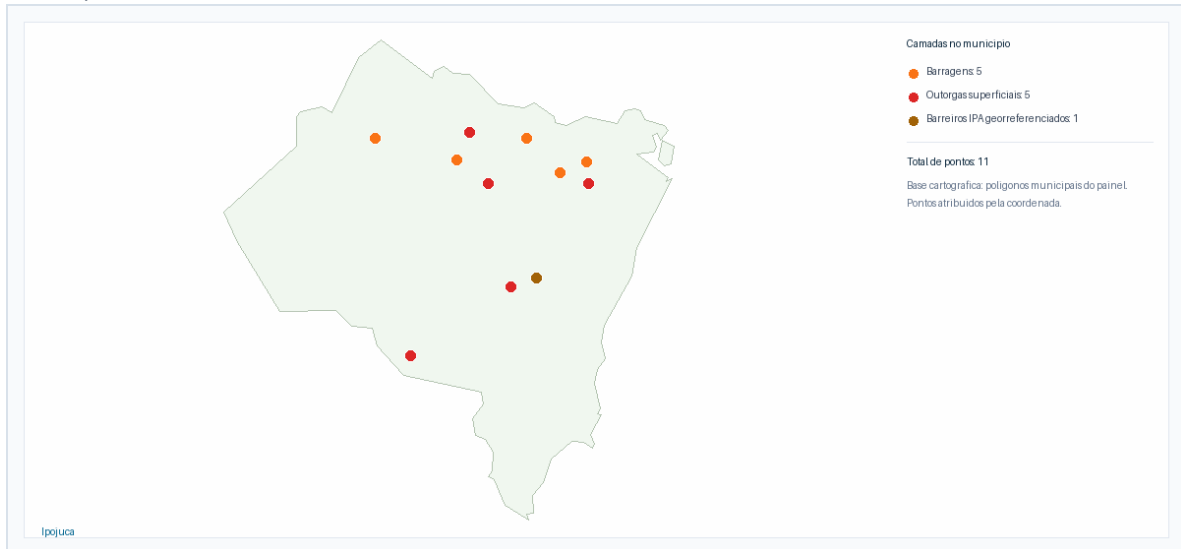

População aglomerada	4.692	21 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 21. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	5
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	5
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	11 iniciativas; 4 projetos KML; R\$ 241,6 mi atribuídos ao município
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	5 Barragens; 5 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	11
Concluídas	6
Em execucao	1
Planejadas	4
Investimento municipal	R\$ 241,6 mi
Investimento ativo	R\$ 234,4 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Realizar consulta pública - Barragem do Engenho Maranhão e ampliação do sistema produtor dos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Data: 2026-08-06; execucao: 0%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0281	Barragem do Engenho Maranhão e ampliação do sistema produtor dos municípios do C	A licitar	0%	Realizar consulta pública 2026-08-06	R\$ 100,6 mi
GPI0040	Implantação do SES Porto de Galinhas - 1ª Etapa Útil	Em andamento	70%	Concluir obra 2026-12-31	R\$ 65,0 mi
GPI0315	SES Nossa Senhora do Ó	A licitar	0%	- 2029-12-31	R\$ 30,0 mi
GPI0083	Ampliação do SAA Suape a partir da implantação da 2ª captação do Rio Ipojuca (pr	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-10-30	R\$ 29,9 mi
GPI0306	SES Porto de Galinhas (2ª Etapa – Parcial)	A iniciar	0%	Emitir ordem de serviço 2026-08-30	R\$ 9,0 mi
GPI0462	Implantação de Novo Sistema de Abastecimento Complexo Industrial de Suape	Concluído	100%	- 2025-02-28	R\$ 2,4 mi
GPI0348	Intervenções para viabilizar o recebimento definitivo da 1ª etapa da ETE Nossa S	Concluído	100%	- 2026-04-30	R\$ 2,1 mi
GPI0473	Convênio para Implantação de adutora Abastecimento para o Loteamento Rota do Por	Concluído	100%	- 2025-01-31	R\$ 1,2 mi
GPI0546	Melhoria do SAA Muro Alto	Concluído	100%	- 2024-09-05	R\$ 826.872
GPI0453	Melhoria do abastecimento de Porto de Galinhas - Área das piscinas naturais	Concluído	100%	- 2025-02-28	R\$ 480.116
GPI0684	Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água	Concluído	100%	- 2026-06-30	R\$ 132.320

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
