


Extrato Municipal - Jaboatão Dos Guararapes

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

Jaboatão Dos Guararapes

Mapa do município

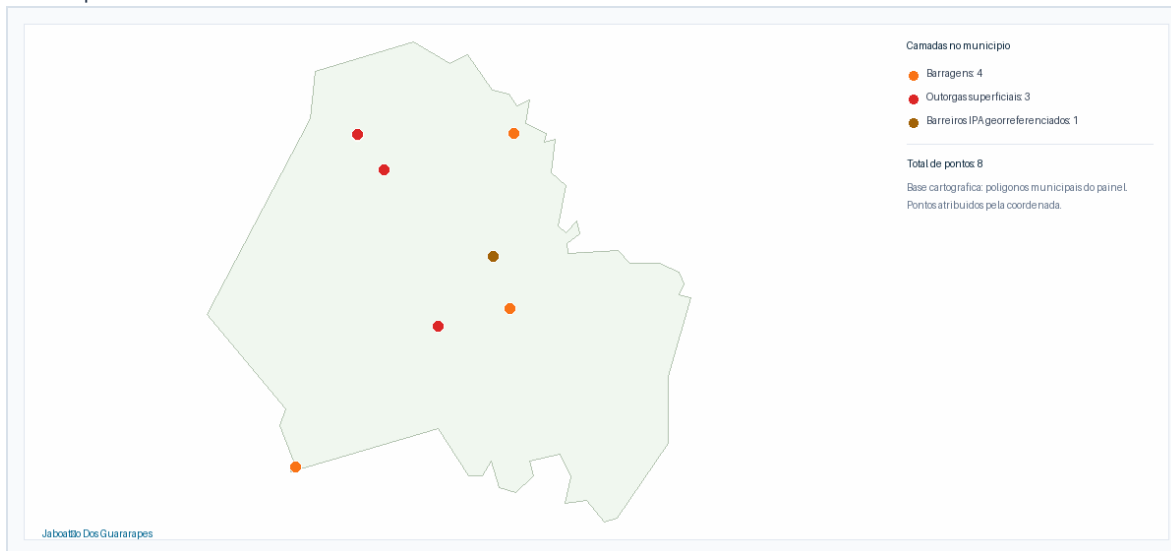

População aglomerada	138	1 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 1. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitarios	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	4
Outorgas subterraneas	0
Outorgas superficiais	3
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituicao	Resumo
Compesa	26 iniciativas; 1 projetos KML; R\$ 675,2 mi atribuídos ao município
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	4 Barragens; 3 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	26
Concluídas	14
Em execucao	6
Planejadas	6
Investimento municipal	R\$ 675,2 mi
Investimento ativo	R\$ 452,6 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - SAA Pirapama - Aquisição e Instalação do Eletrocentro - EEAB Pirapama. Data: 2026-08-28; execucao: 0%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0291	SES Prazeres - 2ª Etapa Útil (SES Barra de Jangada, Cajueiro Seco, Candeias, Pie	Concluído	100%	- 2026-05-21	R\$ 204,6 mi
GPI0059	Construção da Barragem Engenho Pereira	Em andamento	58%	Concluir Obra 2027-08-16	R\$ 128,9 mi
GPI0292	SES Prazeres - 2ª Etapa Útil (Parcial: Candeias e Praia Grande)	Em andamento	0%	Concluir obra 2029-09-30	R\$ 107,0 mi
GPI0084	Ampliação do Sistema Produtor de Moreno e Jaboatão dos Guararapes a partir da Ba	A licitar	0%	Publicar edital de licitação do projeto 2026-08-31	R\$ 79,6 mi
GPI0261	SAA Tapacurá - Requalificação do Sistema Produtor Tapacurá	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-30	R\$ 43,2 mi
GPI0066	Ampliação SAA dos Curados e Manassu (Remanescente)	Em licitação	0%	Emitir Ordem de Serviço 2026-09-30	R\$ 39,7 mi
GPI0284	Recuperação da barragem Pirapama	A licitar	0%	- 2028-12-29	R\$ 18,1 mi
GPI0056	Conclusão da Adutora do Ibura	A retomar	91%	Retomar obra 2027-01-02	R\$ 13,9 mi
GPI0608	Ampliação do SAA Jaboatão Centro	Concluído	100%	- 2023-09-05	R\$ 12,6 mi
GPI0271	Requalificação da Estação de Tratamento de Efluentes Pirapama	A licitar	0%	Publicar edital 2026-08-30	R\$ 10,7 mi
GPI0156	SAA Pirapama - Aquisição e Instalação do Eletrocentro - EEAB Pirapama	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-28	R\$ 4,1 mi
GPI0188	SAA Tapacurá - Retrofit dos filtros da ETA Castelo Branco	Em andamento	62%	Concluir obra 2026-09-21	R\$ 3,5 mi
GPI0154	SAA Pirapama - Retrofit da ETA Pirapama	Em andamento	84%	Concluir obra 2026-09-14	R\$ 2,9 mi
GPI0653	Implantação do Sistema de abastecimento de água da localidade de Curcurana	Concluído	100%	- 2023-02-02	R\$ 1,5 mi
GPI0374	Sistema Adutor para Abastecimento do Centro de Atendimento Socioeducativo – CASE	Concluído	100%	- 2025-10-10	R\$ 1,1 mi
GPI0157	SAA Pirapama - Retrofit da Estação Elevatória - EEAB Pirapama	Em andamento	0%	Concluir obra 2027-04-04	R\$ 889.372

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0642	Implantação do SAA Jardim Cajueiro em Jaboatão dos Guararapes	Concluído	100%	- 2023-03-22	R\$ 842.108
GPI0687	Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água	Concluído	100%	- 2026-06-30	R\$ 832.884
GPI0625	Recuperação da Elevatória de Água Bruta Duas Unas	Concluído	100%	- 2023-05-31	R\$ 629.787
GPI0631	Substituição de 600m de rede devido vazamentos frequentes	Concluído	100%	- 2023-04-30	R\$ 159.887
GPI0554	Implantação de novo trecho da adutora de recalque para reservatório de Noel Rosa	Concluído	100%	- 2024-08-20	R\$ 126.895
GPI0639	Substituição de 126m rede aparente e com vazamentos frequentes	Concluído	100%	- 2023-03-31	R\$ 58.948
GPI0420	Assentamento de 102m de rede para melhoria no abastecimento	Concluído	100%	- 2025-06-30	R\$ 17.743
GPI0461	Assentamento de 60m rede para melhoria no abastecimento	Concluído	100%	- 2025-02-28	R\$ 11.736
GPI0460	Assentamento de 84m de rede para melhoria no abastecimento	Concluído	100%	- 2025-02-28	R\$ 11.211
GPI0594	Substituição de Rede de 63mm que estava com vazamento sob as casas	Concluído	100%	- 2024-02-28	R\$ 9.217

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
