


Extrato Municipal - São Lourenço Da Mata

Gerado em 03/08/2026 08:35. Extrato individual com todas as obras Compesa vinculadas ao município.

São Lourenço Da Mata

Mapa do município

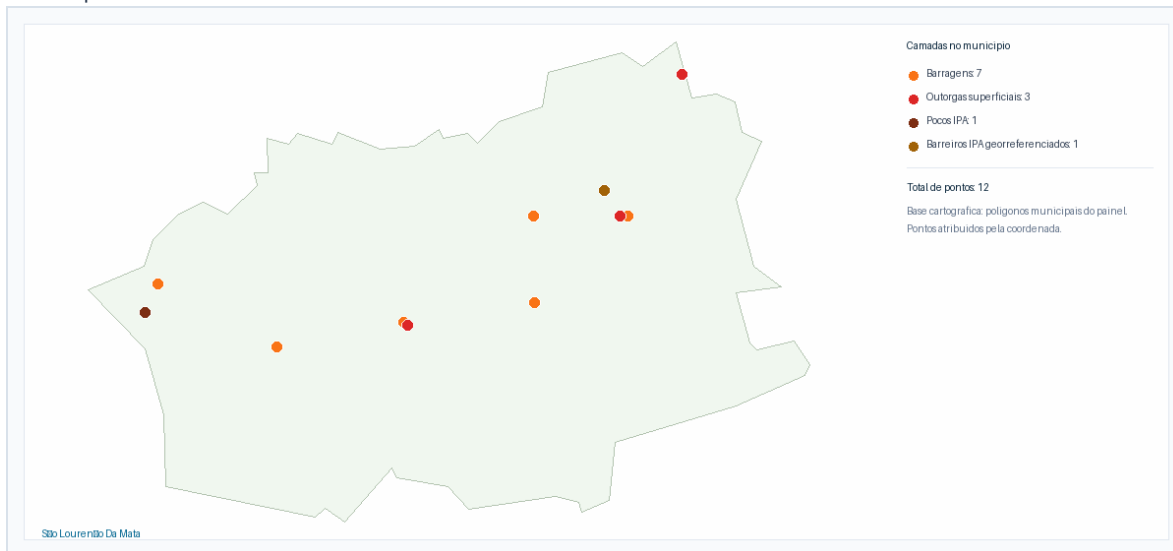

População aglomerada	1.298	5 aglomerados rurais.
Infraestrutura direta	0	Lacuna estimada: 5. Pocos IPA contam apenas quando instalados; perfurados indicam obra ainda não instalada.
Decreto de estiagem	Não	Recorte informado na base de estiagem.

Base	Quantidade
Pocos comunitários	0
Dessalinizadores	0
SAA / SISAR	0
Barragens	6
Outorgas subterrâneas	0
Outorgas superficiais	2
PAD / SDA	0
PISF / SDA	0
Pocos IPA	0
Barreiros IPA georreferenciados	1

Instituição	Resumo
Compesa	12 iniciativas; 5 projetos KML; R\$ 51,2 mi atribuídos ao município
SDA	0 PAD; 0 PISF; 0 aguadas; 0 cisternas
IPA	0 pocos; 0 instalados; 0 barreiros; 0 BPP
SRHS	6 Barragens; 2 Outorgas superficiais

Carteira Compesa municipal

Indicador	Valor
Iniciativas	12
Concluídas	7
Em execucao	1
Planejadas	4
Investimento municipal	R\$ 51,2 mi
Investimento ativo	R\$ 44,3 mi
Atendimento na base	Com carteira ou sem restricao explicita

Proxima etapa: Publicar edital de licitação - Programa de ETAs de Ultrafiltração - ETA Parque Capibaribe 100 L/s. Data: 2026-08-30; execucao: 80%.

Todas as iniciativas Compesa

ID	Iniciativa	Status	Exec.	Proxima etapa / prazo	Valor municipal
GPI0128	Programa de ETAs de Ultrafiltração - ETA Parque Capibaribe 100 L/s	A licitar	80%	Publicar edital de licitação 2026-08-30	R\$ 17,4 mi
GPI0285	Recuperação da barragem Goitá	A licitar	0%	- 2028-04-28	R\$ 10,5 mi
GPI0189	Implantação da Elevatória de Tiúma	A licitar	0%	Publicar edital de licitação 2026-08-30	R\$ 7,4 mi
GPI0205	Retrofit da ETA Várzea do Una	Em andamento	47%	Concluir obra 2027-03-02	R\$ 5,8 mi
GPI0451	Ampliação da ETE 41.02 da 1ª Etapa Útil do SES São Lourenço da Mata	Concluído	100%	- 2025-03-10	R\$ 5,8 mi
GPI0284	Recuperação da barragem Pirapama	A licitar	0%	- 2028-12-29	R\$ 3,1 mi
GPI0637	Requalificação dos Equipamentos Hidromecânicos em Serro Azul	Concluído	100%	- 2023-03-31	R\$ 688.244
GPI0692	Melhoria e Expansão da rede de distribuição de água	Concluído	100%	- 2026-06-30	R\$ 236.487
GPI0430	Assentamento de 640m de rede na rua Nova e rua Dez de Novembro – Pixete	Concluído	100%	- 2025-05-31	R\$ 141.785
GPI0428	Assentamento de 230m de rede no Parque Capibaribe, para melhoria no abasteciment	Concluído	100%	- 2025-05-31	R\$ 35.556
GPI0429	Assentamento de 70m de rede na rua 63 no Parque Capibaribe para melhoria no abas	Concluído	100%	- 2025-05-31	R\$ 13.533
GPI0427	Assentamento de 100m de rede na rua 56 no Parque Capibaribe, para melhoria no ab	Concluído	100%	- 2025-05-31	R\$ 13.170

Populacao beneficiada e informada por iniciativa e nao deve ser somada, pois pode haver sobreposicao entre beneficiarios.
